

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Covernota meetmoment april 2021

Covernota
Monitoring Relanceplan
'Vlaamse Veerkracht'
April 2021

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Aanloop naar het relanceplan	3
3. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan.....	4
3.1. Governance.....	4
3.2. Monitoring.....	5
3.3. Communicatie.....	5
4. Kerncijfers over de relanceprojecten.....	6
Projectstatus: globale voortgang	6
Projectstatus: voortgang per speerpunt.....	7
Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)	7
Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)	7
Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten).....	8
Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)	8
Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten).....	8
Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten)	9
Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten).....	9
Status financiering.....	10
5. Detailcijfers over de relanceprojecten.....	13
Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium	13
Cluster 2 Fietsinfrastructuur	14
Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs.....	14
Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief	14
Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling.....	15
Cluster 6 Blue Deal	15
Cluster 7 Investerings in verkeersveilige wegen.....	16
Cluster 8 Modal shift naar water	16
Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur	16
Cluster 10 Waterstofonderzoek.....	17

Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur.....	17
Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal.....	17
Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid.....	18
Cluster 14 Culturele infrastructuur.....	19
Cluster 15 Investerings onroerend erfgoed.....	20
Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening.....	20
Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn).....	20
Cluster 18 Brexit.....	21
Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur.....	21
Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs.....	21
Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid.....	22
Cluster 22 Investeren in personen met een handicap.....	22
Cluster 23 Sportinfrastructuur.....	22
Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie.....	23
Cluster 25 Investerings groene warmte.....	23
Cluster 26 Digibanken.....	23
Cluster 27 Digitale vaardigheden.....	23
Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector.....	24
Cluster 29 Versterken mentaal welzijn.....	24
Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering.....	25
Cluster 31 Investerings audiovisuele sector.....	25
Cluster 32 Jeugdinfrastructuur.....	25
Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel.....	26
Cluster 34 Spending reviews.....	26
Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten.....	26
6. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV).....	28
7. Leeswijzer bij het globaal rapport.....	28

1. Inleiding

COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro extra om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. Het Vlaamse Relanceplan '[Vlaamse Veerkracht](#)' is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven speerpunten:

- Economie en samenleving verduurzamen
- Investeren in infrastructuur
- Vlaanderen digitaal transformeren
- Investeren in mensen en talenten
- Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
- De coronacrisis beheren en Brexit
- De overheid efficiënter maken

en is doorvertaald in 35 clusters en 180 relanceprojecten. Naast de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen investeert de Vlaamse Regering ook in andere herstelmaatregelen zoals in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw).

Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, heeft de Europese Unie een herstelfonds opgericht, NextGenerationEU. Daarin zit een pakket steun en leningen voor lidstaten, de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). Voor België is er een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan heeft Vlaanderen recht op een maximum van 2,255 miljard euro voor het Vlaamse relanceplan. De restinvestering van ruim 2 miljard euro financiert de Vlaamse overheid zelf.

Deze covernota geeft de aanloop naar het relanceplan weer met de werkzaamheden van het maatschappelijk en het economische relancecomité. Vervolgens wordt de aanpak en de governance van deze monitoring meegegeven. De hoofdbrok van deze covernota betreft de **status m.b.t. de 180 relanceprojecten op het eerste meetmoment van april 2021**. We eindigen de covernota met een leeswijzer bij het globaal monitoringsrapport.

2. Aanloop naar het relanceplan

Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een "Economisch Relancecomité" op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020 om, naast een comité voor de economische relance, ook een "Maatschappelijk Relancecomité" op te richten.

Het Economisch Relancecomité bestaat uit 11 leden: 6 onafhankelijke experts, die elk een prominente rol spelen in hun vakgebied, en 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 6 onafhankelijke experts zijn: Koenraad Debackere (voorzitter), Wouter De Geest, Geert Noels, Stijn Baert, Marion Debruyne en Ans De Vos.

Het Maatschappelijk Relancecomité bestaat uit 18 leden: 9 onafhankelijke experts, die evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn in hun werkdomein, en 9 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 9 onafhankelijke experts zijn: Lieven Annemans (voorzitter), Ive Marx, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu.

Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een [rapport](#) dat werd voorgesteld op 14 juli 2020. De Vlaamse Regering ging met deze rapporten aan de slag en eind september 2020 werd het Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' voorgesteld. In de [Septembeerklaring van 2020](#) ging de minister-president uitvoerig in op de inhoud van dit plan.

3. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan

De Vlaamse Regering legde in een [Mededeling aan de VR van 5 februari 2021](#) vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' de komende jaren zal verlopen.

Het Vlaams Relanceplan wordt vanaf 2021 drie keer per jaar gemonitord (maart-april, augustus-september, november-december) waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling aan de VR.

3.1. Governance

Drie keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht opgevolgd door een Directiecomité. Dit Directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de 11 leden van het Voorzitterscollege (de 10 voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring daarvan. Voorafgaand aan elke Taskforce wordt het monitoringsrapport besproken in het maatschappelijk en het economisch relancecomité en in het klimaatexpertenpanel.

De Taskforce Vlaamse Veerkracht bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen van andere leidend ambtenaren.

De Taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De Taskforce komt drie keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming tussen de betrokken entiteiten en voor de nodige informatiedeling.

Deze oefening wordt ambtelijk getrokken door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën & Begroting die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep, met vertegenwoordiging van de betrokken beleidsdomeinen.

3.2. Monitoring

Het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd doorvertaald naar 158 projecten en een achterliggend relancebudget van 4,3 miljard EURO. Deze lijst werd aangevuld met 22 projecten uit het Vlaams Relanceplan die gefinancierd worden via reguliere middelen.

Concreet rapporteren we dus de komende jaren drie keer per jaar inhoudelijk over 180 projecten en de investeringen die eraan gekoppeld zijn.

De rapportering over de voortgang van het relanceplan Vlaamse Veerkracht bevat basisinformatie die gebruikt kan worden voor de rapportering naar de EU.

3.3. Communicatie

De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol van dit plan:

- De Vlaamse Regering hanteert een [apart label 'Vlaamse Veerkracht'](#) voor beslissingen die hieraan gelinkt zijn. Zo is het voor elke belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug te vinden.
- De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een persmoment na elke vergadering van de Taskforce.
- De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de Vlaamse Regering, met het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen.
- Via www.vlaanderen.be/vlaamseveerkracht:
 - voorziet de Vlaamse Regering een globaal overzicht van de voortgang van de projecten van het relanceplan. Van daaruit kan doorgelinkt worden naar de uitgebreide rapportering.
 - voorziet de Vlaamse Regering 'projecten in de kijker'. Hierbij worden projecten en hun realisaties specifiek uitgelicht.
 - wordt de link gelegd met het Europese Plan voor Herstel en Veerkracht.
- De Vlaamse Regering werkt een communicatiecampagne uit ter begeleiding van de uitvoering van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'.


4. Kerncijfers over de relanceprojecten

Projectstatus: globale voortgang

Het relanceplan telt 158 eenmalige relanceprojecten (elk project kreeg een code van VV001 t.e.m. VV158) en investeert de komende jaren 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij. Daarnaast telt het relanceplan nog eens 22 projecten (VV159 t.e.m. VV180) die gefinancierd worden via (bijkomende) reguliere middelen.

Hieronder kan men de projectstatus van deze 180 relanceprojecten (t.e.m. 2 april 2021) vinden:


- 168 van de 180 relanceprojecten (93,34%) zijn opgestart:
 - 91 projecten of 50,56% hebben de status 'opgestart' maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
 - 77 projecten of 42,78% hebben de status 'opgestart na agendering VR', en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
- Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit project wordt in deel 5 toegelicht.
- Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
- 11 relanceprojecten (6,11%) zijn nog niet gestart (grijs). Deze worden in deel 5 toegelicht.

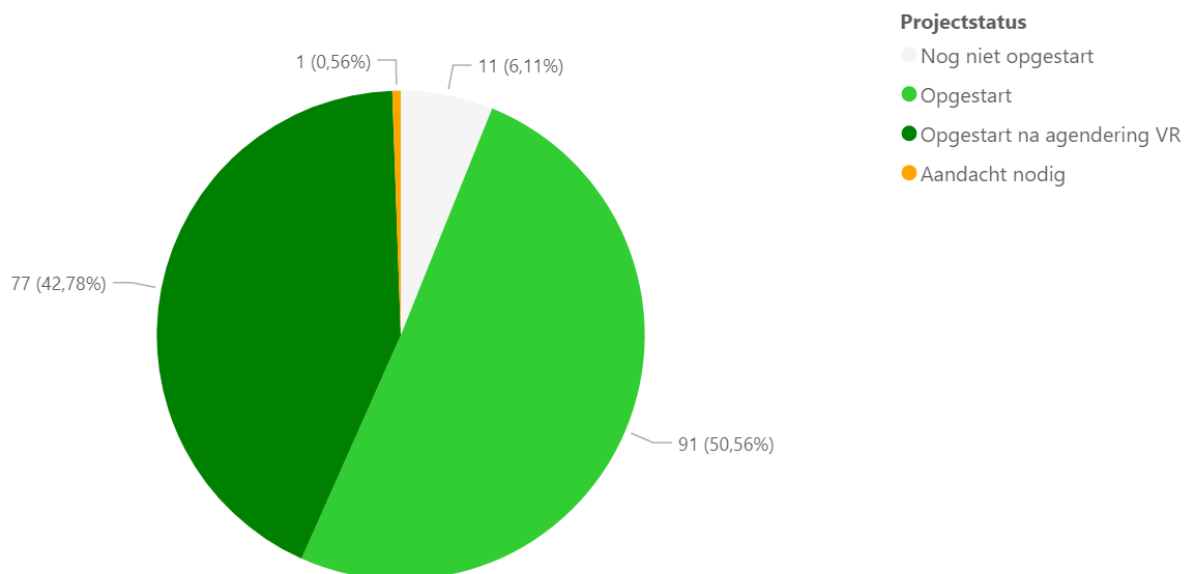


Projectstatus: voortgang per speerpunt

Als we dit bekijken per speerpunt van het relanceplan, dan komen we tot onderstaande grafieken. Bij speerpunt 2 'Investeren in infrastructuur', speerpunt 4 'Investeren in mensen en talenten' en speerpunt 6 'de coronacrisis beheren en Brexit', zien we dat alle projecten begin april opgestart zijn. Vooral bij speerpunt 4 en 6 zien we een groot aantal gestarte projecten, inclusief agendering op de Vlaamse Regering. Bij de overige 4 speerpunten stellen we vast dat een beperkt aantal projecten nog niet is opgestart. Er is 1 project waar bijzondere aandacht naar toe moet gaan, nl. de versnelde uitrol van de digitale meters. Dit project bevindt zich in speerpunt 3. In deel 5 wordt dit project verder toegelicht.


Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)

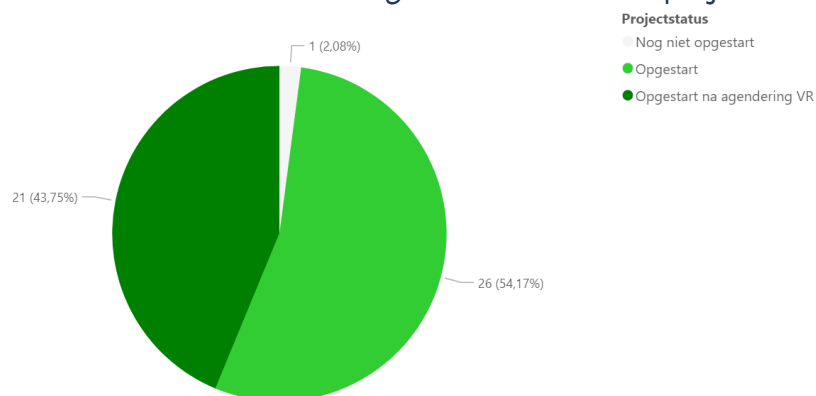


Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)

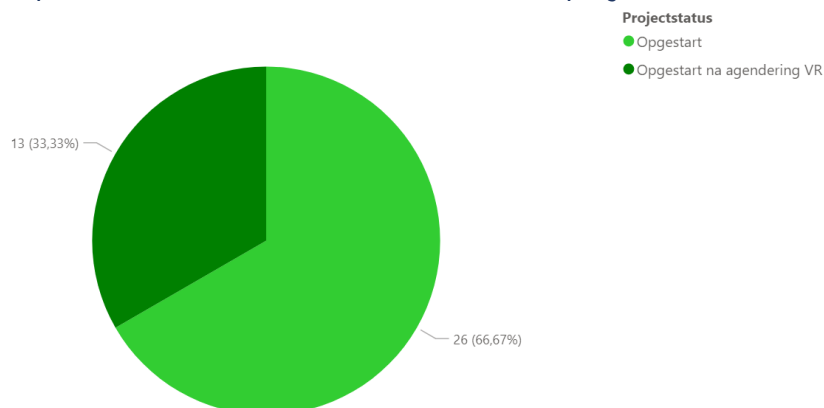


Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten)

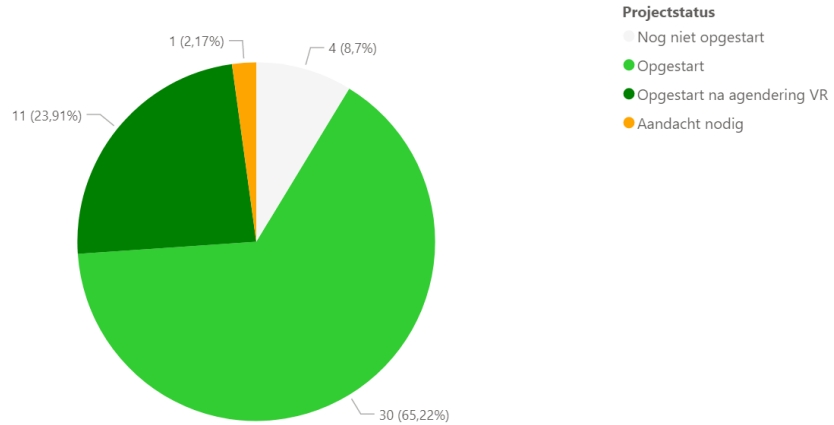


Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)

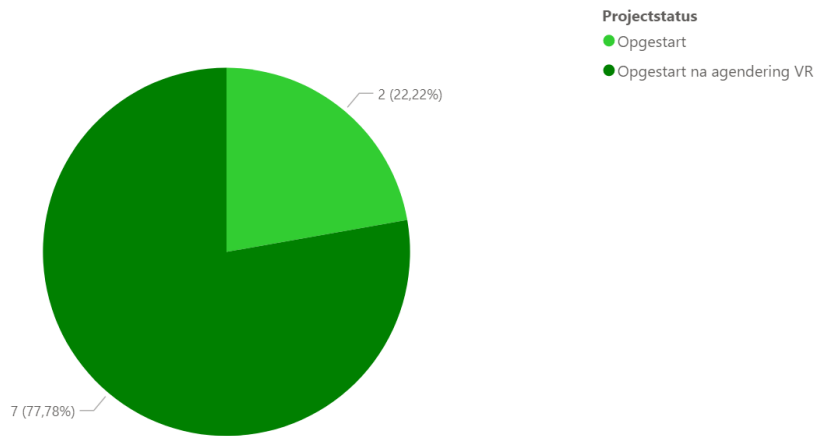


Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)

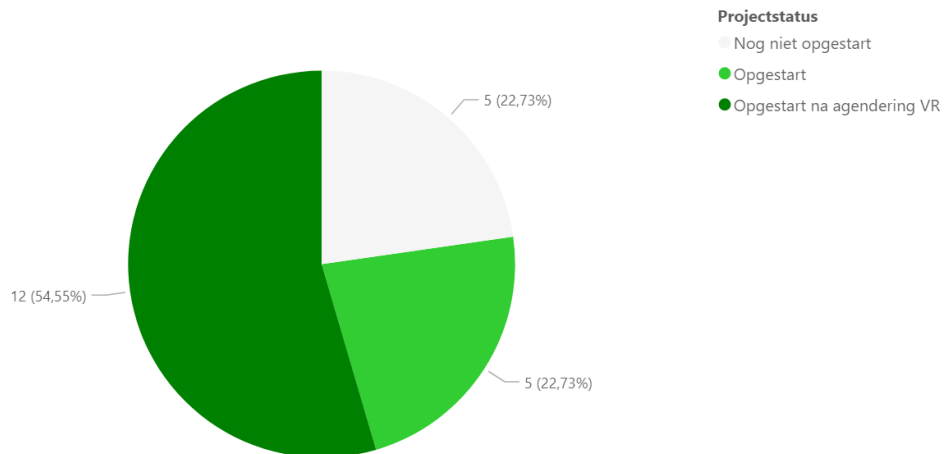

Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten)

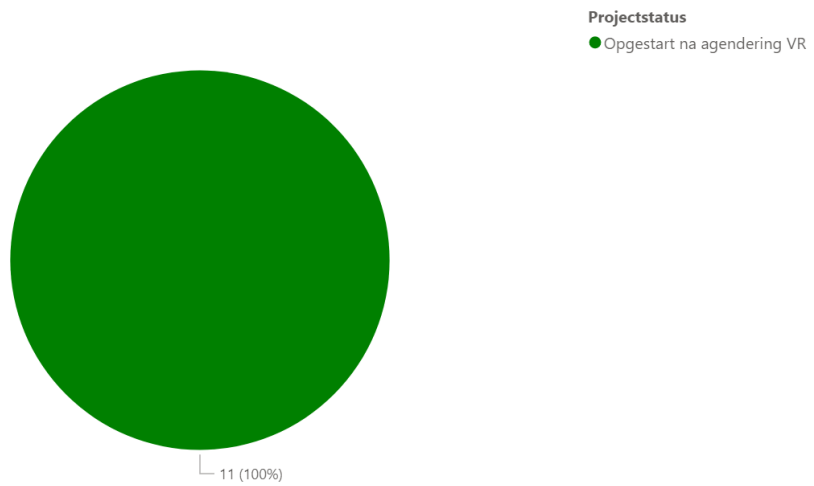


Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)

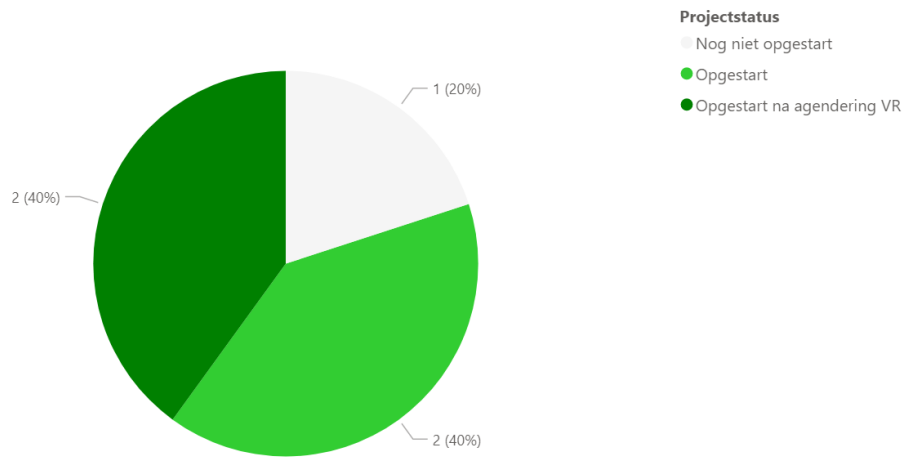


Status financiering



We volgen, zoals eerder aangegeven, drie keer per jaar de voortgang op van de vastleggingen en de vereffeningen gelinkt aan de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. Hieronder kan u de verdeling van deze 4,3 miljard euro relancemiddelen over de 7 speerpunten terugvinden. Dit is voor alle duidelijkheid exclusief het extra budget dat via reguliere middelen wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld zorg (bv. VIA6, uitbreidingsbeleid, wachtlijsten gehandicaptenzorg), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (bv. scholenbouw) (VV159 tot VV180, cf. infra).

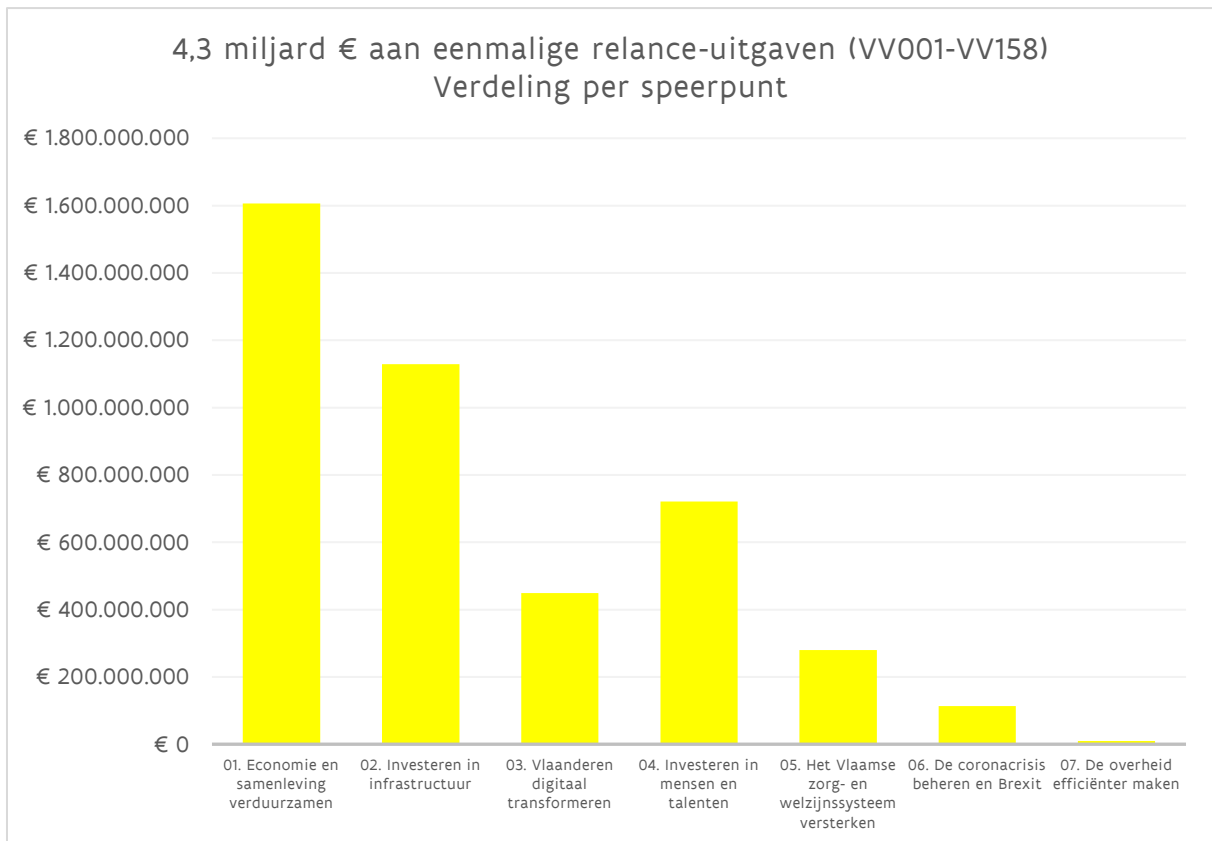

Hieronder kan u de verdeling van deze 4,3 miljard euro over 34 clusters terugvinden. Zoals eerder aangegeven wordt cluster 35 gefinancierd met bestaande en extra reguliere middelen (VV159 tot VV180, cf. infra).

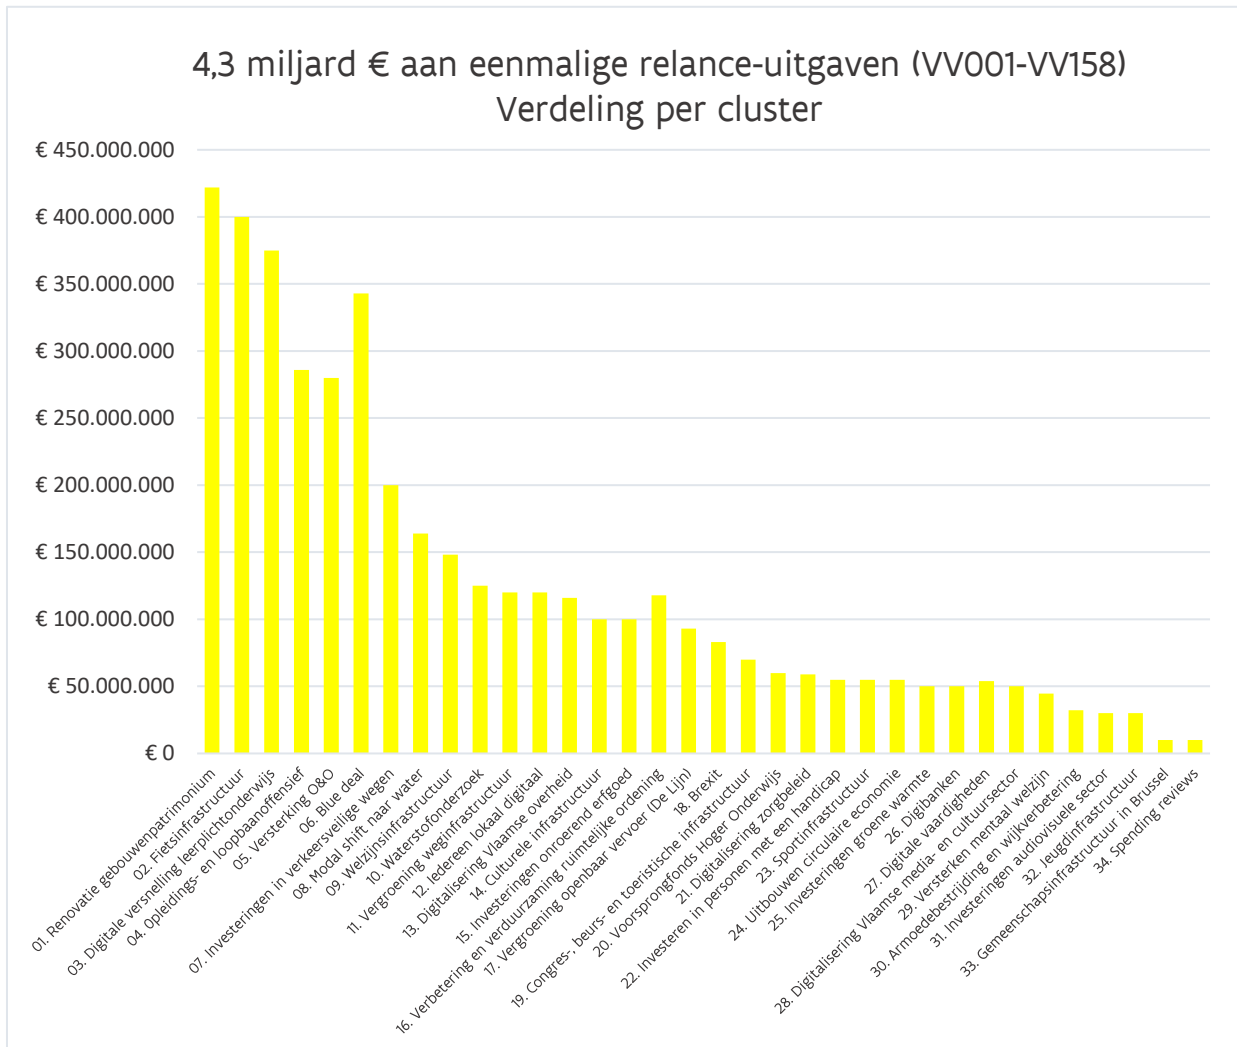

92,16 miljoen euro of 2,14% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen is vastgelegd op meetmoment april 2021. 16,92 miljoen euro of 0,39% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen is begin april vereffend. In deel 5 kan u de details vinden.

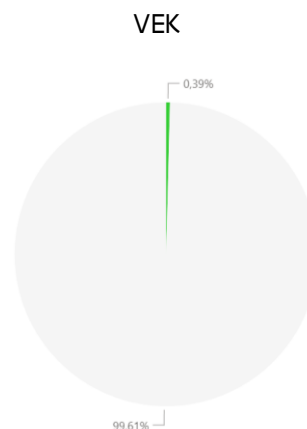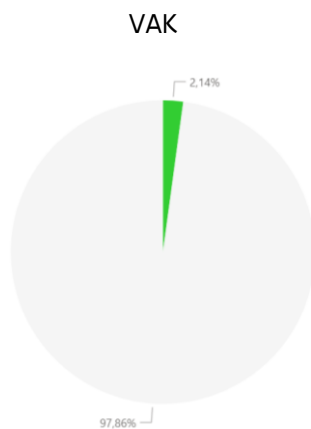

Naast de 158 projecten binnen de eerder toegelichte 34 clusters, die gefinancierd worden door de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering. Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro

Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, nieuwe investeringsbeslissingen deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
 - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
 - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro

5. Detailcijfers over de relanceprojecten

Voor de detailcijfers over de relanceprojecten volgen we de indeling van de [Mededeling aan de VR van 5 februari 2021](#) en werken we aan de hand van 35 clusters. De eerste 34 clusters worden gefinancierd door de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. Cluster 35 wordt gefinancierd met reguliere middelen.

Voor elk project wordt hieronder een statuskleur gegeven (meetmoment april 2021):

- Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering.
- Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering.
- Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten.
- Grijs: Dit project is nog niet gestart.

Daarnaast wordt voor elk project aangegeven wat de begrote middelen zijn, maar ook wat de vastleggingen en vereffeningen zijn begin april 2021.

Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium

11 van de 12 projecten in deze cluster zijn opgestart waarvan er 7 projecten geagendeerd werden op de Vlaamse Regering (donkergroen) en 4 projecten hun dossier nog moeten agenderen op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Het project VV010 'Sociale Woningbouw' werd nog niet opgestart (grijs). In deze cluster is er 1 project met vastleggingen (862.500 €) en vereffeningen (862.500 €) nl. VV012 'verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie'.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV001	Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie		30 mio €	/	/
VV002	Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie		12 mio €	/	/
VV003	Asbestpremie daken residentieel met isolatie		42 mio €	/	/
VV004	Circulaire economie - asbest (lokale besturen)		27,6 mio €	/	/
VV005	Circulaire economie - asbest (sectorprotocollen)		12,4 mio €	/	/
VV006	Financiering energieluik woningrenovatiepremie		180 mio €	/	/
VV007	Financiering flankerend beleid transitie oude elektrische verwarming en toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet		20,05 mio €	/	/
VV008	EPC-labelpremie residentieel		25,35 mio €	/	/
VV009	Renovaties sociale woningen versnellen		30 mio €	/	/
VV010	Sociale woningbouw		5 mio €	/	/

VV011	VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid		20 mio €	/	/
VV012	Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie		17,6 mio €	862.500 €	862.500 €
Totaal			422 mio €	862.500 €	862.500 €

Cluster 2 Fietsinfrastructuur

De 2 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er is al 8.793.737 euro vastgelegd voor het project VV013 'een groter en veiliger fietsnetwerk'.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV013	Een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren		250 mio €	8.793.737 €	/
VV014	Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen		150 mio €	/	/
Totaal			400 mio €	8.793.737 €	/

Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs

Het project digitale versnelling leerplichtonderwijs is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV015	Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digsprong)		375 mio €	/	/

Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief

De 4 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV016	Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC		17 mio €	/	/
VV017	Extra aandacht meest kwetsbaren		90 mio €	/	/
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt		119 mio €	/	/
VV019	Versterken Levenslang Blijven Leren (Edusprong)		60 mio €	/	/
Totaal			286 mio €	/	/

Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling

De 4 projecten in deze cluster zijn opgestart waarvan er al 2 projecten geagendeerd werden op de Vlaamse Regering (donkergroen) en 2 projecten hun dossier nog moeten agenderen op de Vlaamse Regering (lichtgroen). In deze cluster is er 1 project met vastleggingen (2.594.998 €) en vereffeningen (435.000 €) nl. VV022 'versterking O&O bedrijven'.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV020	Bio-economie		20 mio €	/	/
VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscenari's (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)		100 mio €	/	/
VV022	Versterking O&O bedrijven		100 mio €	2.594.998 €	435.000 €
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O		60 mio €	/	/
Totaal			280 mio €	2.594.998 €	435.000 €

Cluster 6 Blue Deal

De 13 projecten in deze cluster zijn opgestart waarvan er 3 projecten al geagendeerd werden op de Vlaamse Regering (donkergroen) en 10 projecten nog moeten worden geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). In deze cluster zijn er 2 projecten met vastleggingen, nl. VV026 'MOW – Blue Deal' (13.689.460 €) en VV036 'Natte natuur' (64.550 €).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte		40 mio €	/	/
VV025	Blue Deal – onderzoek		6 mio €	/	/
VV026	Blue Deal – MOW		35 mio €	13.689.460 €	/
VV027	Blue Deal – Economie		10 mio €	/	/
VV028	Droogteresistente teelten		8 mio €	/	/
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven		10 mio €	/	/
VV030	Hergebruik van restwater		10 mio €	/	/
VV031	Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving		20 mio €	/	/
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen		45 mio €	/	/
VV033	Sensibilisering, opleiding en advisering		6 mio €	/	/
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen		23 mio €	/	/
VV035	Groenblauwe infrastructuur – waterlopen		30 mio €	/	/
VV036	Natte natuur		100 mio €	64.550 €	/
Totaal			343 mio €	13.754.010 €	/

Cluster 7 Investerings in verkeersveilige wegen

Binnen de cluster 'Investerings in verkeersveilige wegen' zijn de 4 projecten opgestart en werden deze al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn voor 3 van de 4 projecten al budgetten vastgelegd voor een som van 26.856.391 €. Voor 1 project is er al voor 2.585.452 € aan vereffeningen.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV037	Assetmanagement - aanpakken cat. 4-kunstbouwwerken in slechte staat		100 mio €	25.425.000 €	2.585.452 €
VV038	Aanpak gevaarlijke punten		50 mio €	555.000 €	/
VV039	Versnelling investeringen in veilige schoolroutes		30 mio €	/	/
VV040	Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding mhoo een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement		20 mio €	876.391 €	/
Totaal			200 mio €	26.856.391 €	2.585.452 €

Cluster 8 Modal shift naar water

Binnen de cluster 'Modal shift naar water' zijn de 4 projecten opgestart. Deze projecten werden daarnaast ook al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er is voor 2 van de 4 projecten al budget vastgelegd voor een som van 3.123.200 euro.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV041	Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)		96 mio €	775.991 €	/
VV042	Modal shift naar water - extra kaaimuren		20 mio €	2.347.209 €	/
VV043	Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit)		21 mio €	/	/
VV044	Onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge		27 mio €	/	/
Totaal			164 mio €	3.123.200 €	/

Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur

Binnen de cluster welzijnsinfrastructuur zijn de projecten nog niet gestart (grijs).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV045	Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid		138,25 mio €	/	/
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen		10 mio €	/	/
Totaal			148,25 mio €	/	/

Cluster 10 Waterstofonderzoek

Het project waterstofonderzoek is opgestart, maar heeft nog geen formele agendering langs de Vlaamse Regering doorlopen (lichtgroen). Er zijn nog geen middelen vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV047	Waterstofonderzoek		125 mio €	/	/

Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur

De 2 projecten onder de cluster vergroening weginfrastructuur zijn opgestart en werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). Er zijn nog geen budgetten vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV048	Investering LED-verlichting gewestwegen (VEKP)		90 mio €	/	/
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur		30 mio €	/	/
Totaal			120 mio €	/	/

Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal

Alle projecten onder de cluster 'iedereen lokaal digitaal' zijn opgestart. 1 van de 6 opgestarte projecten kende al een agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen), de andere 5 nog niet (lichtgroen). Enkel voor project VV051 zijn al vastleggingen gebeurd binnen deze cluster.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV050	Digitalisering integratie & inburgering		15 mio €	/	/
VV051	Gemeente zonder gemeentehuis		35 mio €	182.758 €	/
VV052	Iedereen digitaal – digibuddies		5 mio €	/	/
VV053	Iedereen digitaal - opleiding & vorming		15 mio €	/	/
VV054	Iedereen digitaal - toegang tot computers & internet		30 mio €	/	/
VV055	Smart Cities		20 mio €	/	/
Totaal			120 mio €	182.758 €	/

Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid

20 van de 21 projecten onder de cluster digitalisering Vlaamse overheid zijn opgestart. 5 van de 20 opgestarte projecten werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen), 15 van de 20 opgestarte projecten nog niet (lichtgroen). 1 project is nog niet gestart (grijs). 571.152 euro is reeds vastgelegd en 27.160 euro is reeds vereffend binnen deze cluster.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV056	Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening - onboarding raamcontract 2022		15 mio €	/	/
VV057	Ondersteuning Digitale transformatie Vlaamse entiteiten en lokale besturen		5 mio €	/	/
VV058	AIV - Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening (incl. bijdrage subsidieregister)		3 mio €	/	/
VV059	Digitalisering asset management Aquafin		9 mio €	/	/
VV060	Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel		10 mio €	/	/
VV061	Datanutsbedrijf		23 mio €	/	/
VV062	Digitalisering DBRC - toegang tot de Vlaamse bestuursrechtspraak		1,6 mio €	/	/
VV063	Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck		1 mio €	/	/
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening		1 mio €	/	/
VV065	HFB - Cybersecurity en uitrol SIEM (Security Information & Event Management)		2,5 mio €	87.984 €	27.160 €
VV066	HFB - Hybride Digitale werkplek		1 mio €	/	/
VV067	HFB - Modernisering Cloud en netwerkinfrastructuur		3,5 mio €	483.168 €	/
VV068	Kaleidos – Digitalisering besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering		2,4 mio €	/	/
VV069	MaaS (Mobility as a Service)		5 mio €	/	/
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem		1,95 mio €	/	/
VV071	Poolstokalias		2 mio €	/	/
VV072	Doelgericht digitaal transformeren		5 mio €	/	/
VV073	Sensor Data Platform		8,5 mio €	/	/
VV074	Vastgoedinformatieplatform		9 mio €	/	/
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse		2,45 mio €	/	/
VV076	Regie op eigen gegevens en zelf beheerde identiteit		4 mio €	/	/
Totaal			115,9 mio €	571.152 €	27.160 €

Cluster 14 Culturele infrastructuur

De 22 culturele infrastructuurprojecten zijn opgestart maar moeten nog worden geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Vastleggingen zijn er nog niet gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV077	Belfort Aalst		1,093 mio €	/	/
VV078	Cultuurhuis Blankenberge		3 mio €	/	/
VV079	deSingel Antwerpen		1,65 mio €	/	/
VV080	Groeningeabdij Kortrijk		7,5 mio €	/	/
VV081	Grote Culturele Infrastructuur		5 mio €	/	/
VV082	Hotel Dumont Antwerpen		0,75 mio €	/	/
VV083	Inventaris infrastructuur		0,6 mio €	/	/
VV084	Kunst in opdracht in de publieke ruimte		3 mio €	/	/
VV085	Kursaal Oostende		9 mio €	/	/
VV086	Masterplan Schouwburg Kortrijk		7,8 mio €	/	/
VV087	Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)		4,98 mio €	/	/
VV088	MOOOV Turnhout		1,3 mio €	/	/
VV089	Musea Brugge nieuwe Museumsite		27,253 mio €	/	/
VV090	Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas		0,9 mio €	/	/
VV091	Nieuwbouw de Kopergieterij Gent		2,125 mio €	/	/
VV092	Nieuwe bibliotheek Sint-Niklaas		0,3 mio €	/	/
VV093	Nieuwe huisvesting en depotruimte voor het Vlaams Architectuur Instituut		5,8 mio €	/	/
VV094	Kunstenwerkplaats 'KC Groenplein' Hasselt		5,1 mio €	/	/
VV095	Parterre CC De Werf Aalst		0,45 mio €	/	/
VV096	Schouwburg Boom		0,3 mio €	/	/
VV097	Sectorale investeringssubsidies		7 mio €	/	/
VV098	Versnelling Opera Gent		5 mio €	/	/
Totaal			99,001 mio €	/	/

Cluster 15 Investerings onroerend erfgoed

Het project VV099 is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen middelen vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV099	Investerings in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed		100 mio €	/	/

Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening

Alle projecten onder deze cluster zijn opgestart. 4 projecten werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), 2 projecten nog niet (lichtgroen). Er is al een vastlegging van 23 miljoen euro en een vereffening van 11 miljoen euro m.b.t. project VV103 'Lantis – PFOS-vervuiling'.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV100	Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen		15 mio €	/	/
VV101	Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen		10 mio €	/	/
VV102	Investeren in kernversterking via projectoproepen		25 mio €	/	/
VV103	Lantis - PFOS-vervuiling		23 mio €	23 mio €	11 mio €
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing)		20 mio €	/	/
VV105	Ontsnipperen van Vlaams landschap		25 mio €	/	/
Totaal			118 mio €	23 mio €	11 mio €

Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)

Het project VV106 Vergroening openbaar vervoer is opgestart en kende al een agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen middelen vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV106	Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)		93 mio €	/	/

Cluster 18 Brexit

De 3 Brexit-projecten zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn al middelen vastgelegd voor VV107 en middelen vastgelegd en vereffend voor VV109.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit		3 mio €	3 mio €	/
VV108	Subsidies aan bedrijven (financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten		30 mio €	/	/
VV109	VLAIO Brexit actieplan		50 mio €	77.834 €	53.271 €
Totaal			83 mio €	3.077.834 €	53.271 €

Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur

De twee projecten van cluster 19 zijn opgestart maar de dossiers moeten nog geagendeerd worden op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er is nog geen budget vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV110	Congres (5 MEUR BBV)		20 mio €	/	/
VV111	Hefboomrelanceprojecten		50 mio €	/	/
Totaal			70 mio €	/	/

Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

Het project Voorsprongfonds Hoger Onderwijs is opgestart en kende al een passage langs de Vlaamse Regering (donkergroen). Hier zijn nog geen middelen vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV112	Voorsprongfonds Hoger Onderwijs		60 mio €	/	/

Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid

6 van de 8 projecten onder de cluster 'digitalisering zorgbeleid' zijn opgestart maar moeten wel nog op de agenda van de Vlaamse Regering worden geplaatst (lichtgroen). VV114 en VV116 moeten nog worden opgestart (grijs). Er zijn nog geen middelen vastgelegd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV113	Blended care jeugdhulp		5 mio €	/	/
VV114	Digitale hulpverlening – kwaliteitsbevordering		0,5 mio €	/	/
VV115	Digitalisering RIZIV-sectoren		11 mio €	/	/
VV116	Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorg en ondersteuningsplan		30 mio €	/	/
VV117	Enkelbanden		4 mio €	/	/
VV118	Groepakket - verderzetten digitalisering		7 mio €	/	/
VV119	Ontwikkelen rechtenverkenner 2.0 met een meer gebruiksvriendelijke tool in sterke samenwerking met de lokale besturen		1 mio €	/	/
VV120	Verbeteren van de sociale kaart		0,5 mio €	/	/
Totaal			59 mio €	/	/

Cluster 22 Investeren in personen met een handicap

Project VV121 Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1 is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV121	Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1		55 mio €	/	/

Cluster 23 Sportinfrastructuur

Het project m.b.t. het versterken van de bovenlokale sportinfrastructuur is opgestart en werd al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV122	Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur		55 mio €	/	/

Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie

Alle projecten onder cluster 24 werden opgestart. Deze moeten wel nog worden geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV123	Circulair bouwen		10 mio €	/	/
VV124	Circulaire economie		15 mio €	/	/
VV125	Circulaire economie – Recyclagehub		30 mio €	/	/
Totaal			55 mio €	/	/

Cluster 25 Investerings groene warmte

Het project m.b.t. groene warmte is opgestart maar moet wel nog op de Vlaamse Regering worden geagendeerd (lichtgroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV126	Call groene warmte		50 mio €	/	/

Cluster 26 Digibanken

Het project digibanken is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV127	Digibanken		50 mio €	/	/

Cluster 27 Digitale vaardigheden

Het project m.b.t. digitale vaardigheden is opgestart maar moet wel nog op de Vlaamse Regering worden geagendeerd (lichtgroen). Er zijn al vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV128	Digitale vaardigheden		54 mio €	139.698 €	/

Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector

1 van de 7 projecten binnen de cluster 'digitalisering Vlaamse media- en cultuursector' is nog niet opgestart (grijs). 6 projecten zijn wel al opgestart, waarvan er al 4 op de agenda van de Vlaamse Regering kwamen (donkergroen), en 2 nog niet (lichtgroen). Bij 2 projecten zijn er al vastleggingen gebeurd in deze cluster, bij 1 project al vereffeningen.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV129	Cultuur - Betere informatiedoorstroming en koppeling databanken		0,25 mio €	/	/
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties		5 mio €	/	/
VV131	Cultuur - Integratietraject erfgoeddatabanken		2 mio €	/	/
VV132	Digitaal verenigingsloket – investering		2,85 mio €	550.442 €	22.570 €
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector (CJSM)		29 mio €	105.938 €	/
VV134	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector (EWI)		10 mio €	/	/
VV135	Investeren in het versterken van mediawijsheid bij de burger		1 mio €	/	/
Totaal			50,1 mio €	656.380 €	22.570 €

Cluster 29 Versterken mentaal welzijn

6 van de 9 projecten ter versterking van het mentaal welzijn zijn opgestart. 5 van deze opgestarte projecten kenden al een passage langs de Vlaamse Regering (donkergroen), 1 van deze opgestarte projecten nog niet (lichtgroen). 3 van de 9 projecten moeten nog worden opgestart (grijs). Voor vernieuwende projecten Huizen van het Kind, de opvolging van het actieplan mentaal welzijn, de OverKophuizen en de aanpak intra-familiaal geweld is al 8,48 miljoen euro vastgelegd. Er is voor dat laatste bedrag al 1.933.333 euro vereffend.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV136	Vernieuwende projecten Huizen van het Kind		3 mio €	3 mio €	800.000 €
VV137	Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen		3,5 mio €	/	/
VV138	Opvolging actieplan mentaal welzijn		6,5 mio €	1,7 mio €	1.133.333 €
VV139	OverKophuizen		4,8 mio €	1,28 mio €	/
VV140	Samenwerkingsverbanden "één gezin, één plan"		3,2 mio €	/	/
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg		3 mio €	2,5 mio €	/
VV142	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - bewustmakingscampagnes		0,3 mio €	/	/
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt		0,25 mio €	/	/
VV144	Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven		20 mio €	/	/
Totaal			44,55 mio €	8,48 mio €	1.933.333 €

Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering

Alle projecten ter bestrijding van armoede en m.b.t. wijkverbetering zijn opgestart. Er zijn nog geen middelen vastgelegd in deze cluster. De helft van deze projecten werd reeds geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), voor de andere helft moet dit nog gebeuren (lichtgroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV145	Buitenschoolse opvang ondersteunen		11,4 mio €	/	/
VV146	Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)		0,975 mio €	/	/
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs		1,8 mio €	/	/
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen		2,4 mio €	/	/
VV149	Ondersteuning buurtwerk		7,5 mio €	/	/
VV150	Wijkverbetering		4 mio €	/	/
VV151	Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen		1,125 mio €	/	/
VV152	Projectoproep kwetsbare kinderen		3 mio €	/	/
Totaal			32,2 mio €	/	/

Cluster 31 Investerings audiovisuele sector

Alle projecten m.b.t. de investering in de audiovisuele sector zijn opgestart en kenden al een agendering op de VR (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV153	Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector		10 mio €	/	/
VV154	Impuls aan VAF Filmfonds		10 mio €	/	/
VV155	Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds		10 mio €	/	/
Totaal			30 mio €	/	/

Cluster 32 Jeugdinfrastructuur

Het project jeugdinfrastructuur is opgestart maar moet wel nog worden geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV156	Jeugdinfrastructuur		30 mio €	/	/

Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

Het project gemeenschapsinfrastructuur in Brussel is opgestart maar moet wel nog worden geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel		10 mio €	/	/

Cluster 34 Spending reviews

Het project spending reviews is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er werden al middelen vastgelegd, nl. 69.084 euro.

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)	VAK	VEK
VV158	Spending reviews		10 mio €	69.084 €	/

Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten

Naast de 158 projecten binnen de eerder toegelichte 34 clusters, die gefinancierd worden door de 4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering. Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro

Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, nieuwe investeringsbeslissingen deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
 - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
 - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro

20 projecten krijgen de status 'opgestart'. 12 projecten werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), voor 8 projecten moet dit nog gebeuren (lichtgroen).

1 project is nog niet opgestart (grijs), nl. VV161 'Decentralisatieoefening naar lokale besturen'.

Voor 1 project is bijzondere aandacht nodig (oranje). Bij VV168 'Versnelde uitrol digitale meters' is de nood aan bijkomende aandacht te linken aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De

acceptatiegraad van een digitale meter van de netgebruikers is sterk gedaald en leidt tot een vertraging in de uitrol.

Vastleggingen en vereffeningen worden in deze cluster niet apart opgevolgd en kan men opvolgen via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT).

Proj.nr.	Projectomschrijving	Status	Beleidsruimte (begroot)
VV159	Snellere vergunnings- en beroepsprocedures		Reguliere middelen
VV160	Administratieve vereenvoudiging		0,25 mio € (uit middelen VV158)
VV161	Decentralisatieoefening naar lokale besturen		Reguliere middelen
VV162	Investeren in Vlaamse kennisoverheid		1 mio €
VV163	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's		500 mio €
VV164	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant (3 miljard euro) en voor PMV-Z-Waarborgen (400 miljoen euro) - hefboom voor maximale bancaire financiering		3,4 mia €
VV165	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat)		240 mio €
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel		Reguliere middelen
VV167	Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2.0		3,078 mia € tijdens deze regeerperiode
VV168	Versnelde uitrol digitale meters		2 mia € investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025
VV169	Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G		Reguliere middelen
VV170	Flanders Future Tech Fund aanwenden voor innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie		75 mio €
VV171	Vlaanderen chiplab van de wereld		70 mio €
VV172	Investeringsmiddelen in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO ² captatie & hergebruik		Reguliere middelen
VV173	Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun		Reguliere middelen
VV174	Noodkoopleningen		40 mio €
VV175	Uitbreidingsbudget voor welzijn en zorg		1,1395 mia € (VIA 6-budget van 577 mio €, ook 562,5 mio. € extra middelen voor uitbreidingsbeleid)
VV176	Zijnstroom vanuit de privésector naar onderwijs aantrekkelijk maken		4 mio €
VV177	Implementatie van de Vlaamse jobbonus		329 mio €
VV178	Extra zuurstof voor individueel creatief talent – meesterschap		Reguliere middelen
VV179	Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen		Reguliere middelen
VV180	Wachlijsten gehandicaptenzorg		130 mio €

6. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV)

De feedback van het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de eerste voortgangsrapportering werd op 20/04 besproken in de Taskforce.

7. Leeswijzer bij het globaal rapport

In bijlage kan men de rapportering van april 2021 voor alle 180 projecten volgens cluster terugvinden.

In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer:

- Bevoegde minister
- Trekkende entiteit Vlaamse overheid
- Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project
- Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
- Andere belanghebbenden

De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort:

- Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in de septemberverklaring.
- Cluster relanceplan: 1 van de 35 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 5 februari 2021

De projectomschrijving:

- Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven.

Agendering Vlaamse Regering

- Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 2 april 2021 met een link naar deze documenten.

Algemene beschrijving van de projectvoortgang:

- Geeft weer wat de algemene status is van het globale project aan de hand van een beschrijving en een kleurencode:
 - Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering

- Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering
- Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten
- Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk
- Grijs: nog niet gestart

Gedetailleerde projectvoortgang:

- Beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde projectrealisaties aan de hand van een beschrijving en een status. Hier kan ook worden aangegeven welke politieke beslissingen noodzakelijk zijn. De volgende statussen zijn mogelijk:
 - Op schema: uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdsplan
 - Vertraging: uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging op het afgesproken tijdsplan
 - Uitgesteld: de uitvoering wordt uitgesteld naar een later moment
 - Nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdsplan
 - Stopgezet: in de zin van definitief stopgezet en dus niet uitgesteld
 - Bij te sturen: hiervoor is actie noodzakelijk
 - Gerealiseerd

Projectfinanciering:

- Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer. De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees) zal bij de meting in september per project weergegeven worden. 55 van de 180 projecten van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een [Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021](#).
