

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht: vierde meting 1 juni 2022

Samenvatting: Deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het vierde meetmoment van 1 juni 2022.

1. INLEIDING

Deze mededeling bevat een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het meetmoment 1 juni 2022.


Het Vlaams Relanceplan werd al drie keer gemonitord in 2021, nl. in maart, in september en in december van 2021. In 2022 zijn er twee meetmomenten voorzien, nl. in juni en in december 2022.

2. RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT

Het relanceplan telt 158 eenmalige relanceprojecten (elk project kreeg een code van VV001 t.e.m. VV158) en investeert de komende jaren 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij, met 7 speerpunten:

1. Economie en samenleving verduurzamen;
2. Investeren in infrastructuur;
3. Vlaanderen digitaal transformeren;
4. Investeren in mensen en talenten;
5. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken;
6. De coronacrisis beheren en Brexit;
7. De overheid efficiënter maken.

4,3 miljard € aan eenmalige relance-uitgaven (VV001-VV158) Verdeling per speerpunt

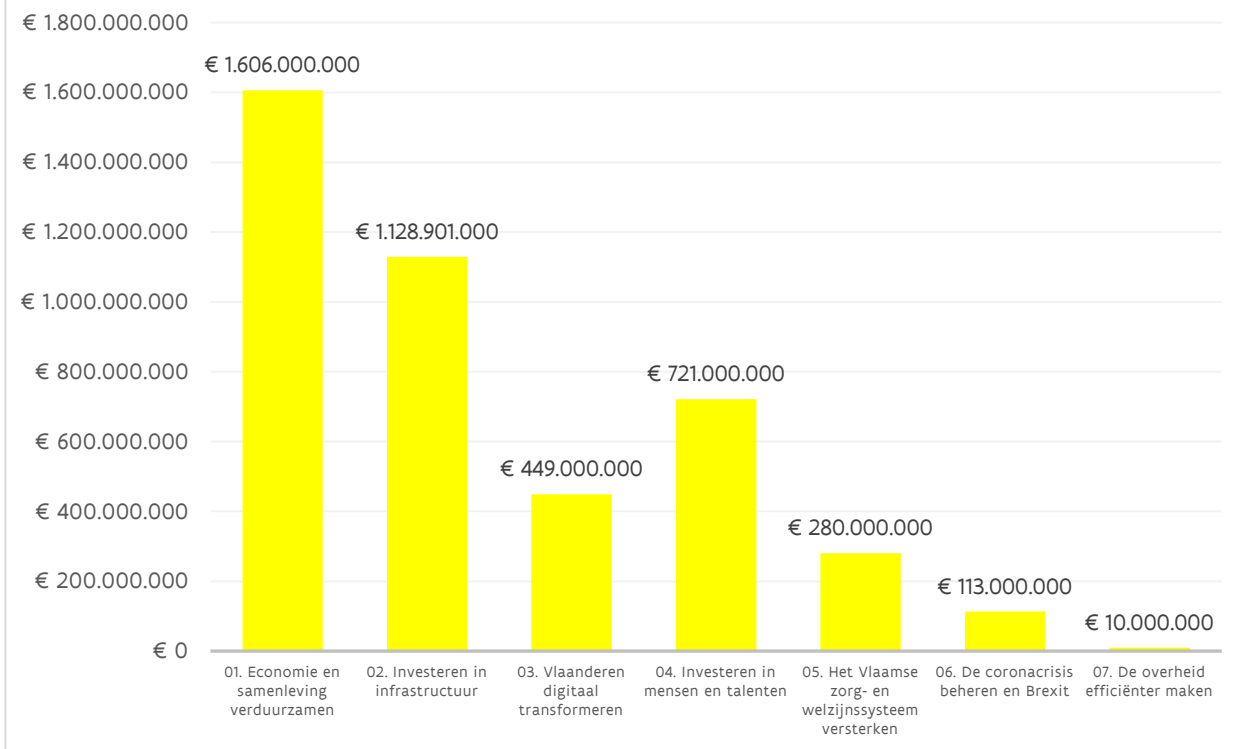

Naast de 158 projecten, die gefinancierd worden door de 4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering (projecten VV159 t.e.m. 180). Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro

Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, cumulatief budget tot het einde van deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
 - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
 - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro

3. VOORTGANG UITVOERING RELANCEPROJECTEN 1 JUNI 2022

Hieronder kan men de voortgang van deze 180 relanceprojecten op meetmoment 1 juni 2022 vinden, inzake globale voortgang, inzake mijlpalen en inzake vastleggingen en vereffeningen.

Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema


Ondanks de vijf covid-golven en de Oekraïne-crisis is de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema. 96% van de projecten verloopt volgens schema, 92% van de opgestarte mijlpalen staat op gerealiseerd of op schema. Ook bij de vastleggingen zien we een substantiële sprong naar 46,5% van de relancemiddelen of 2 miljard euro.

96% van de projecten op schema

In vergelijking met de meting in maart, september en december 2021 is opnieuw een duidelijke vooruitgang geboekt. Meer dan 96% van de projecten verlopen globaal op schema bij het vierde meetmoment van juni 2022.

Voortgang

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd

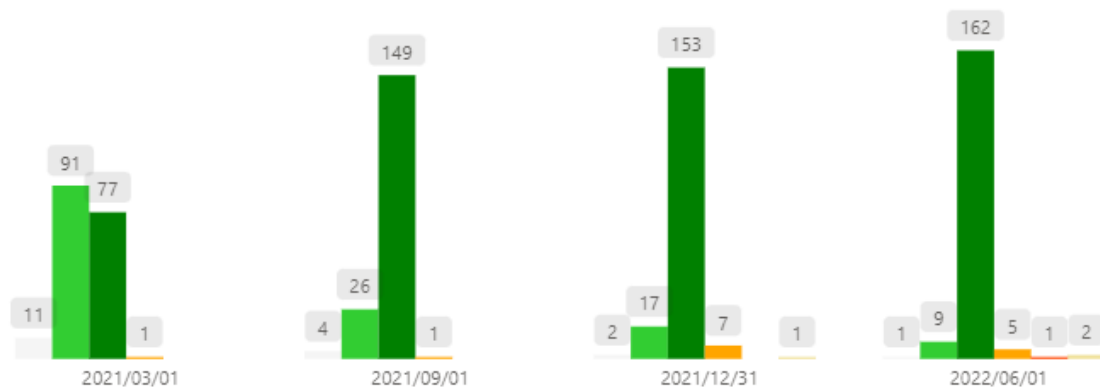

173 van de 180 relanceprojecten (96%) zijn in juni 2022 in uitvoering en lopen op schema:

- 9 projecten (5%) hebben de status 'opgestart' maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
- 162 projecten of (90%) hebben de status 'in uitvoering na agendering VR', en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
- 2 projecten of (1%) hebben de status 'gerealiseerd'. Het gaat over VV146 'Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)' en VV139 'Overkophuizen'.

Voor 5 van de 180 relanceprojecten (3%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft:

- VV014 'Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen: de maatregel is positief onthaald en de aanmeldingen komen binnen, maar volstaan niet om de beoogde doelstellingen te behalen. Op lokaal niveau dienen de nodige middelen te worden voorzien in de meerjarenplanning. De beschikbare lokale personeelscapaciteit speelt verder ook een rol. Er loopt een tussentijdse evaluatie met het oog op een bijsturing van het BVR, om de scope van het project uit te breiden en om de modaliteiten aan te passen.
- VV056 'Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022': de operationele service integratiediensten, evenals de verschillende ICT-dienstverleningspakketten zijn van start gegaan op 1 februari 2022. De transitie kon echter nog niet volledig worden afgerond. Er zijn echter geen grote

onderbrekingen in de ICT-dienstverlening. De verwachting t.o.v. de ICT-partners is om de dienstverlening uiterlijk eind juni 2022 naar het beoogde peil te brengen.


- VV087 'Materniteit de Bijloke – de Creatiecluster (Gent)': het initiatief vergt een investeringssubsidie van 4,98 miljoen euro voor een maximum van 60% van de totale projectkost. De budgettering van het project is nog niet volledig rond. In afwachting van bijkomende financiering wordt het dossier nog niet aan de Vlaamse Regering voorgelegd.
- VV120 'Verbeteren van de sociale kaart': de externe firma, die in de eerste fase de ontwikkeling van de vernieuwde database en de toepassing doet, loopt ernstige vertraging op. Was de toepassing initieel voorzien voor 2021 Q2, zal deze pas in Q3 van 2022 klaar zijn. Hierdoor verschuift alles en dus ook de planning van het uitbreidingsproject met de voorziene relancemiddelen.
- VV168 'Versnelde uitrol digitale meter': in samenwerking met intercommunales en private bedrijven investeren we in een versnelde uitrol van digitale meters, een investering van ongeveer 2 miljard euro door Fluvius, gespreid over 10 jaar. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de terugdraaiende teller vernietigde, werd de uitrol achteruit geschoven en is er nog steeds heel wat twijfel om een digitale meter te laten installeren. Door corona ontstaat bijkomende vertraging en is uitrol van 80% tegen 2025 een grote uitdaging.

Eén relanceproject krijgt de projectstatus 'rood', waarbij bijkomende actie noodzakelijk is. Het gaat over VV078 'Cultuurhuis Blankenberge'. Het initiële projectvoorstel voorzag in een nieuw cultuurhuis voor de stad Blankenberge. Het gemeentebestuur communiceerde in het najaar van 2021 dat het de 3 miljoen euro voor een andere (niet-culturele) invulling zou aanwenden. Het gemeentebestuur kon echter geen alternatief project voorleggen dat aan de bestedingsvoorschriften voldeed. De Vlaamse minister voor Cultuur heeft daarom beslist om de relancemiddelen opnieuw vrij te maken.

Eén relanceproject is nog niet gestart (grijs). Het gaat over VV142 'Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes'. Het blijft de bedoeling om de campagne in 2022 te lanceren. De vastlegging zal bijgevolg in 2022 gebeuren.

92% van de opgestarte mijlpalen op schema of gerealiseerd

Tussen meting 3 van december 2021 en meting 4 van juni 2022 werden bijkomende mijlpalen aangebracht en steeg het aantal van 1257 naar 1469 mijlpalen. Deze mijlpalen situeren zich tussen de jaren 2020 en 2030.

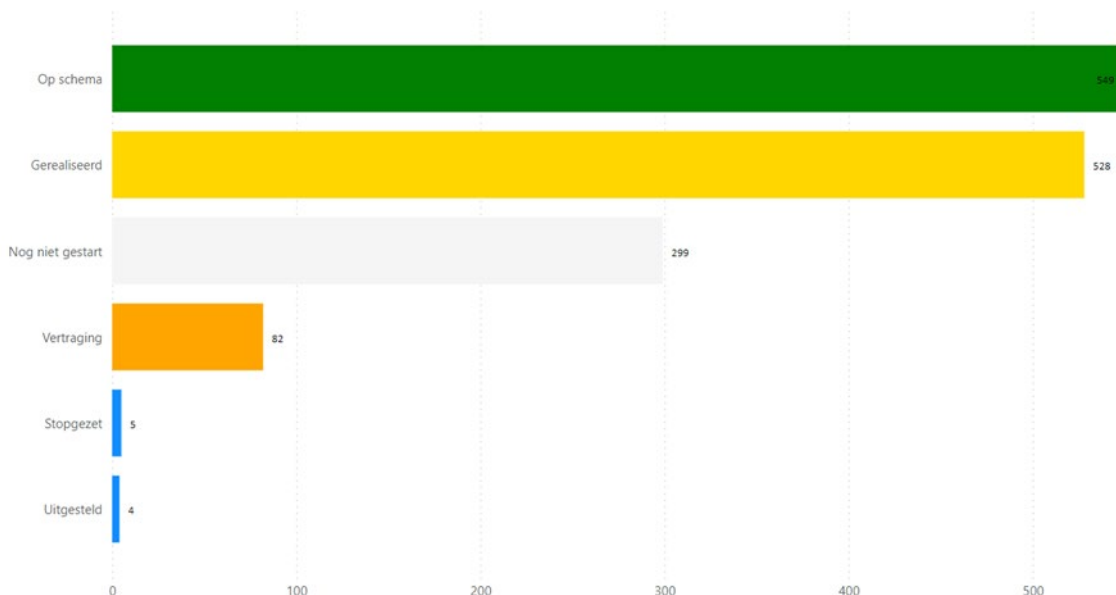

1077 van de 1469 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030 zijn, ofwel op schema, ofwel gerealiseerd. Dit is 73,3% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (299 of 20,4%), dan komen we zelfs aan 92% van de opgestarte mijlpalen die in juni 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn. 82 mijlpalen hebben vertraging, 5 mijlpalen werden stopgezet, en 4 mijlpalen werden uitgesteld.

Er worden verschillende redenen aangehaald voor de 82 vertraagde mijlpalen: gebrek aan interne en externe capaciteit, bijgestelde planning door een groter dan verwachte complexiteit of onvoorziene omstandigheden, men wacht op een beslissing van een andere overheid, interne enveloppeverschuivingen tussen projecten binnen Vlaamse Veerkracht, het financieel plan is nog onvolledig,

Vier mijlpalen werden uitgesteld. Uitgestelde mijlpalen zijn mijlpalen waarbij de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal nog niet zijn opgestart, en waar een nieuwe deadline voor een mijlpaal gepland wordt. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de uitgestelde mijlpalen: focuswijziging, noodzaak aan bijkomende besluitvorming, uitstel van een publiek event omwille van COVID, en prioritering omwille van de Oekraïne-crisis.

Vijf mijlpalen werden stopgezet. In dat geval worden de activiteiten voor het realiseren van de mijlpaal niet opgestart of verdergezet. Er worden verschillende redenen aangehaald voor de stopgezette mijlpalen: focuswijziging, hogere kostprijs van de projecten, heroriëntering van middelen voor Oekraïne maatregelen, en de vervanging van een initiatief door een ander initiatief dat wel nog kan worden aanbesteed in 2022.


Substantiële sprong in vastleggingen naar 46,5% van de relancemiddelen

Op 1 juni 2022 was er 2 miljard euro of 46,5% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen vastgelegd. Dat is 476 miljoen euro meer dan bij de vorige meting in december 2021.

446 miljoen euro of 10% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was begin juni vereffend. Dat is een stijging van 227 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting.


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● Resterend

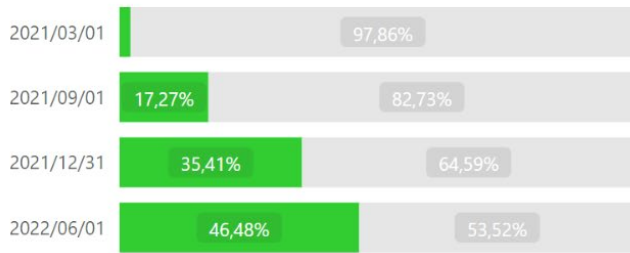

Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend

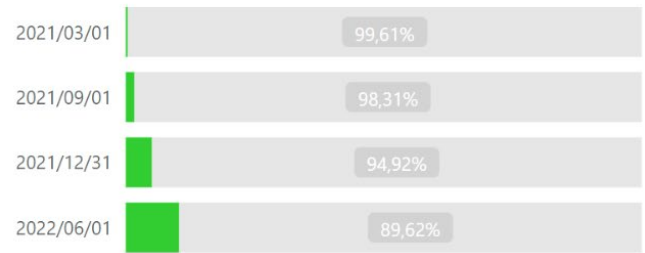

4. FEEDBACK VANUIT HET MAATSCHAPPELIJK RELANCECOMITÉ, HET ECONOMISCH RELANCECOMITÉ, HET KLIMAATEXPERTENPANEL EN DE SOCIALE PARTNERS (SERV)

De feedback van het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de vierde voortgangsrapportering werd op 14 juli 2022 besproken in de Taskforce.

5. BIJLAGES

BIJLAGE 1: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: covernota meetmoment 1 juni 2022

BIJLAGE 2: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgang per cluster meetmoment 1 juni 2022

BIJLAGE 3: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgangsrapport meetmoment 1 juni 2022

BIJLAGE 4: Dashboard Vlaamse Veerkracht

BIJLAGE 5: Communicatie Vlaamse Veerkracht

Jan JAMBON

Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
