



# **Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lus van Henegouwen'**

**Procesnota (opstartfase)**

1	Overlegstructuur .....	5
1.1	Het planteam .....	5
1.2	Verduidelijkingen van rollen in het proces .....	5
1.2.1	Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Elia .....	5
1.2.2	Rol van de MER-coördinator .....	6
1.3	Overlegstructuur – andere overlegorganen .....	8
1.4	Vlaamse regering beslist .....	8
2	Procesverloop en -aanpak .....	9
2.1	Opstartfase .....	10
2.1.1	Doelstelling – onderzoek .....	10
2.1.2	Overleg- en participatie - timing .....	10
2.1.3	Documenten .....	11
2.2	Scopingfase .....	11
2.2.1	Doelstelling – onderzoek .....	11
2.2.2	Overleg- en participatie .....	11
2.2.3	Timing .....	12
2.2.4	Documenten .....	12
2.3	Ontwerp planvormingsfase .....	12
2.3.1	Doelstelling – onderzoek .....	12
2.3.2	Overleg-en participatie .....	12
2.3.3	Timing .....	12
2.3.4	Documenten .....	12
2.4	Planvormingsfase .....	13
2.4.1	Doelstelling – onderzoek .....	13
2.4.2	Overleg-en participatie .....	13
2.4.3	Timing .....	13
2.4.4	Documenten .....	13
2.5	Goedkeuringsfase .....	14
2.5.1	Doelstelling – onderzoek .....	14
2.5.2	Overleg-en participatie .....	14
2.5.3	Timing .....	14
2.5.4	Documenten .....	14
3	Bijlagen .....	15
3.1	Verslagen van planteam .....	15
3.2	Verslag overleg met lokale besturen .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
1	Overlegstructuur .....	5
1.1	Het planteam .....	5
1.2	Verduidelijkingen van rollen in het proces .....	5
1.2.1	Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Elia .....	5
1.2.2	Rol van de MER-coördinator .....	6
1.3	Overlegstructuur – andere overlegorganen .....	8
1.4	Vlaamse regering beslist .....	8

2	Procesverloop en -aanpak .....	9
2.1	Opstartfase.....	10
2.1.1	Doelstelling – onderzoek.....	10
2.1.2	Overleg- en participatie - timing .....	10
2.1.3	Documenten.....	11
2.2	Scopingfase .....	11
2.2.1	Doelstelling – onderzoek.....	11
2.2.2	Overleg- en participatie .....	11
2.2.3	Timing.....	12
2.2.4	Documenten.....	12
2.3	Ontwerp planvormingsfase.....	12
2.3.1	Doelstelling – onderzoek.....	12
2.3.2	Overleg-en participatie .....	12
2.3.3	Timing.....	12
2.3.4	Documenten.....	12
2.4	Planvormingsfase.....	13
2.4.1	Doelstelling – onderzoek.....	13
2.4.2	Overleg-en participatie .....	13
2.4.3	Timing.....	13
2.4.4	Documenten.....	13
2.5	Goedkeuringsfase .....	14
2.5.1	Doelstelling – onderzoek.....	14
2.5.2	Overleg-en participatie .....	14
2.5.3	Timing.....	14
2.5.4	Documenten.....	14
3	Bijlagen .....	15
3.1	Verslagen van planteam .....	15
3.2	Verslag overleg met lokale besturen .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

# Procesnota

Dit document is de procesnota bij de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Lus van Henegouwen'.

In deze procesnota, opgemaakt bij de opstart van het planproces, vindt u een overzicht van het proces en overleg in de reeds doorlopen opstartfase. Daarnaast staat ook in deze procesnota welke volgende stappen zijn voorzien. Dit gebeurt door per fase van het proces aan te geven wat de doelstelling van de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin zullen worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke inspraak- en participatiemomenten u mag verwachten.

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en –aanpak terug te vinden. Voor alle inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar de startnota die in deze fase samen met de procesnota raadpleegbaar is. Met deze eerste procesnota en de bijhorende startnota start de Vlaamse overheid het planproces voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan formeel op.

## Contact en info:

Departement Omgeving

<https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lusvanhenegouwen>

Email: [gop.omgeving@vlaanderen.be](mailto:gop.omgeving@vlaanderen.be)

Telefoon: 02. 553 11 71 (Chris Fermon)

Adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel

# 1 Overlegstructuur

## 1.1 Het planteam

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten van de onderzoeken in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP op en bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het inspraakmoment over de startnota en het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren en maakt er een verslag van op.

Het planteam is de auteur van deze procesnota en bestaat uit een vaste kern van vertegenwoordigers van het departement Omgeving, meer bepaald:

- erkende ruimtelijk planners
- vertegenwoordiger van het team MER
- vertegenwoordigers van het team Omgeving en Gezondheid

De samenstelling van het planteam kan in de loop van het proces wijzigen.

Waar nodig laat het planteam zich ondersteunen door bijkomende deskundigen en technische experts.

- Voor de milieubeoordeling bijvoorbeeld wordt beroep gedaan op MER-deskundigen en een MER-coördinator van Antea Group.
- Voor een aantal technische aspecten van het onderzoek wordt beroep gedaan op de expertise van Elia. Elia is de enige beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit en zal deze hoogspanningsinfrastructuur bouwen, beheren en uitbaten als onderdeel van het gekoppelde zeer hoge spanningsnet. Vanuit deze rol is hun expertise noodzakelijk als input voor het proces.

Indien nodig wordt er bilateraal overlegd met vertegenwoordigers van diverse administraties.

## 1.2 Verduidelijkingen van rollen in het proces

### 1.2.1 Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Elia

Het GRUP 'Lus van Henegouwen' kadert in de taken van algemeen belang die op Elia rusten om een zeker, betrouwbaar en doeltreffend hoogspanningsnetwerk te verwezenlijken en bij te dragen tot de energiebevoorradingszekerheid.

De Vlaamse overheid is dan weer bevoegd voor de opmaak van het GRUP 'Lus van Henegouwen'.

De Vlaamse overheid en Elia hebben dus elk een eigen specifieke rol bij de opmaak van het GRUP 'Lus van Henegouwen'.

De Vlaamse overheid, in het bijzonder het departement Omgeving, stuurt het planteam aan dat instaat voor de voorbereiding en opmaak van het beoogde GRUP. Het departement Omgeving treedt op als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering die de bevoegde overheid is om het GRUP uiteindelijk vast te stellen. De ruimtelijk planner binnen het planteam behoort ook tot het departement Omgeving.

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt

voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp-GRUP op en bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het inspraakmoment over de startnota en het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren en maakt er een verslag van op.

Als belangrijkste partner in het planteam is het departement Omgeving ook het officiële aanspreekpunt voor het brede publiek, in het bijzonder tijdens de inspraak over de startnota en tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Elia, die het project ‘Lus van Henegouwen’ wenst te realiseren in het kader van het federaal ontwikkelingsplan voor het transmissienet, is als Belgische transmissienetbeheerder een belangrijke actor bij de opmaak van het GRUP voor dit project.

Elia is een privaat bedrijf met taken van algemeen belang die gecontroleerd worden door publieke instanties. Specifiek dient Elia het vermogen van het transmissienet op lange termijn te waarborgen en te voldoen aan redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit door het uitbaten, onderhouden en ontwikkelen, onder economisch aanvaardbare voorwaarden, van een zeker, betrouwbaar en doeltreffend transmissienet, mits het wijden van alle vereiste aandacht aan de eerbied voor het leefmilieu<sup>1</sup>. De federale minister voor energie keurt het ontwikkelingsplan voor het zeer hoge spanningsnetwerk (150-380kV) goed. De federale regulator voor energie, de CREG, keurt onder meer de budgetten goed die worden aangewend voor het vervullen van deze taken en de billijke winstmarge<sup>2</sup> voor de transmissienetbeheerder. De vertaling daarvan in de tarieven voor het transport van elektriciteit die worden aangerekend aan alle Belgisch eindverbruikers gebeurt overeenkomstig een door de CREG vierjaarlijks vastgestelde tariefmethodologie en tariefbeslissing<sup>3</sup>.

Vanuit haar taken van openbaar belang, hier specifiek de ontwikkeling en uitbating van het hoogspanningsnet, informeert Elia de Vlaamse overheid over de technische aangelegenheden die met de realisatie van Ventilus te maken hebben.

Als enige beheerder van het Belgische transmissienet beschikt Elia ook over specifieke technische kennis over de ontwikkeling, het beheer en de uitbating van hoogspanningsnetwerken die noodzakelijk is om met voldoende kennis van zaken beslissingen te nemen over het beoogde GRUP. Input van Elia aan de Vlaamse overheid is dan ook essentieel om het GRUP Ventilus te kunnen realiseren. Er wordt dan ook zoveel als nodig overlegd tussen het planteam en Elia. In haar hoedanigheid van betrokken actor staat Elia het planteam ook bij tijdens de inspraakmomenten met het brede publiek. De ambtelijke samenstelling en centrale rol van het planteam en de onafhankelijkheid van de MER-coördinator en de MER-deskundigen garanderen daarbij de onafhankelijke en neutrale uitwerking van het plan-MER en het GRUP. De input van Elia is daarbij uiteraard onderworpen aan de controle van de betrokken deskundigen.

## 1.2.2 Rol van de MER-coördinator

Het plan-MER wordt opgemaakt ‘*onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer*’. De initiatiefnemer doet voor de opmaak van het plan-MER, zoals de regelgeving voorschrijft, beroep

---

<sup>1</sup> Artikel 8 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

<sup>2</sup> De billijke winstmarge is de vergoeding die de netbeheerder krijgt voor de investering van het eigen vermogen en die wordt berekend, overeenkomstig een vaste formule rekening houdend met de lange termijn rente, op 40% van de regulated asset base. De regulated asset base vertegenwoordigt de waarde van alle in dienst genomen investeringen. Deze waarde varieert onder meer op basis van de afschrijvingen van de investeringen en bijkomende indienstnames. De billijke winstmarge wordt aangevuld met enkele incentives die door de regulator worden opgelegd.

<sup>3</sup> Beschikbaar op de website van de CREG: [www.creg.be](http://www.creg.be)

op een erkende MER-coördinator, stelt aan deze MER-coördinator alle relevante informatie ter beschikking en verleent alle medewerking opdat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De erkende MER-coördinator die is aangesteld door de initiatiefnemer van het voorgenomen plan, *'mag geen belang hebben bij het voorgenomen plan of programma of de alternatieven, noch betrokken worden bij de latere uitvoering van het plan of programma'*. Hij *'voert zijn opdracht volledig onafhankelijk uit en geeft in voorkomend geval leiding aan een team van medewerkers dat geheel of gedeeltelijk door de initiatiefnemer ter beschikking wordt gesteld'*.

Elia heeft ook de plan-MER-verplichtingen van de Vlaamse overheid overgenomen, zoals voorzien is in de Vlaamse regelgeving. Dit betekent dat Elia de MER-coördinator en -deskundigen heeft aangesteld om het planteam bij te staan bij het onderzoek naar mogelijke milieu-effecten. Deze MER-coördinator en -deskundigen die zijn aangesteld, beschikken over een formele erkenning die hun onafhankelijkheid garandeert. Elia bezorgt aan de MER-coördinator alle relevante (technische) informatie en medewerking die deze nodig heeft om de milieubeoordeling op planniveau op te maken. Voor het GRUP 'Lus van Henegouwen' is Elia dus de initiatiefnemer van het plan-MER en Sofie Claerbout van Antea Group de MER-coördinator.

De belangrijkste MER-deskundigen zijn in onderstaande tabel aangegeven. De coördinatie van de startnota gebeurde door Sofie Claerbout.

<b>Deskundige</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Erkenningsnummer</b>	<b>Deskundige</b>
Sofie Claerbout	Coördinatie	LNE/ERK/MERCO/2019 /00005	Sofie Claerbout
	Biodiversiteit	MB/MER/EDA-804	
Inge Van Der Mueren	Bodem	MB/MER/EDA-692-V1	Inge Van Der Mueren
	Water	MB/MER/EDA-692-B	
Paul Arts	Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie	MB/MER/EDA-664-V1	Paul Arts
	Mens - sociaal organisatorische aspecten		
Ulrik van Soom	Mens gezondheid	MB/MER/EDA-351	Ulrik van Soom
Christian Busschots	Geluid en trillingen	MB/MER/EDA-371/v4	Christian Busschots

### **1.3 Overlegstructuur – andere overlegorganen**

Het planteam is het centrale, maar niet het enige overlegorgaan in dit planproces. Het planproces gaat uit van een overlegmodel waarbij het planteam deel is van een bredere overlegstructuur. Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor overleg met de gemeenten.

### **1.4 Vlaamse regering beslist**

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 'Lus van Henegouwen' worden genomen door de Vlaamse Regering.

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota. Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp GRUP en over het definitieve GRUP.


Naast deze formeel voorziene stappen wordt niet uitgesloten dat tussentijds bijkomende kennisgevingen aan of beslissingen van de Vlaamse Regering (zullen) worden voorzien. Dit kan bijvoorbeeld voorliggend plan van aanpak zijn dat in deze procesnota vervat zit, de scopingnota, een mogelijk tracé,...



## 2 Procesverloop en -aanpak

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. Elk proces vereist immers specifiek en aangepast overleg en onderzoeken. De regelgeving, in dit geval de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), legt niet vast hoe vaak er vergaderd moet worden of welke onderzoeksgegevens minimaal vereist zijn.

De VCRO legt wel een kader en spelregels vast. Elk planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases.

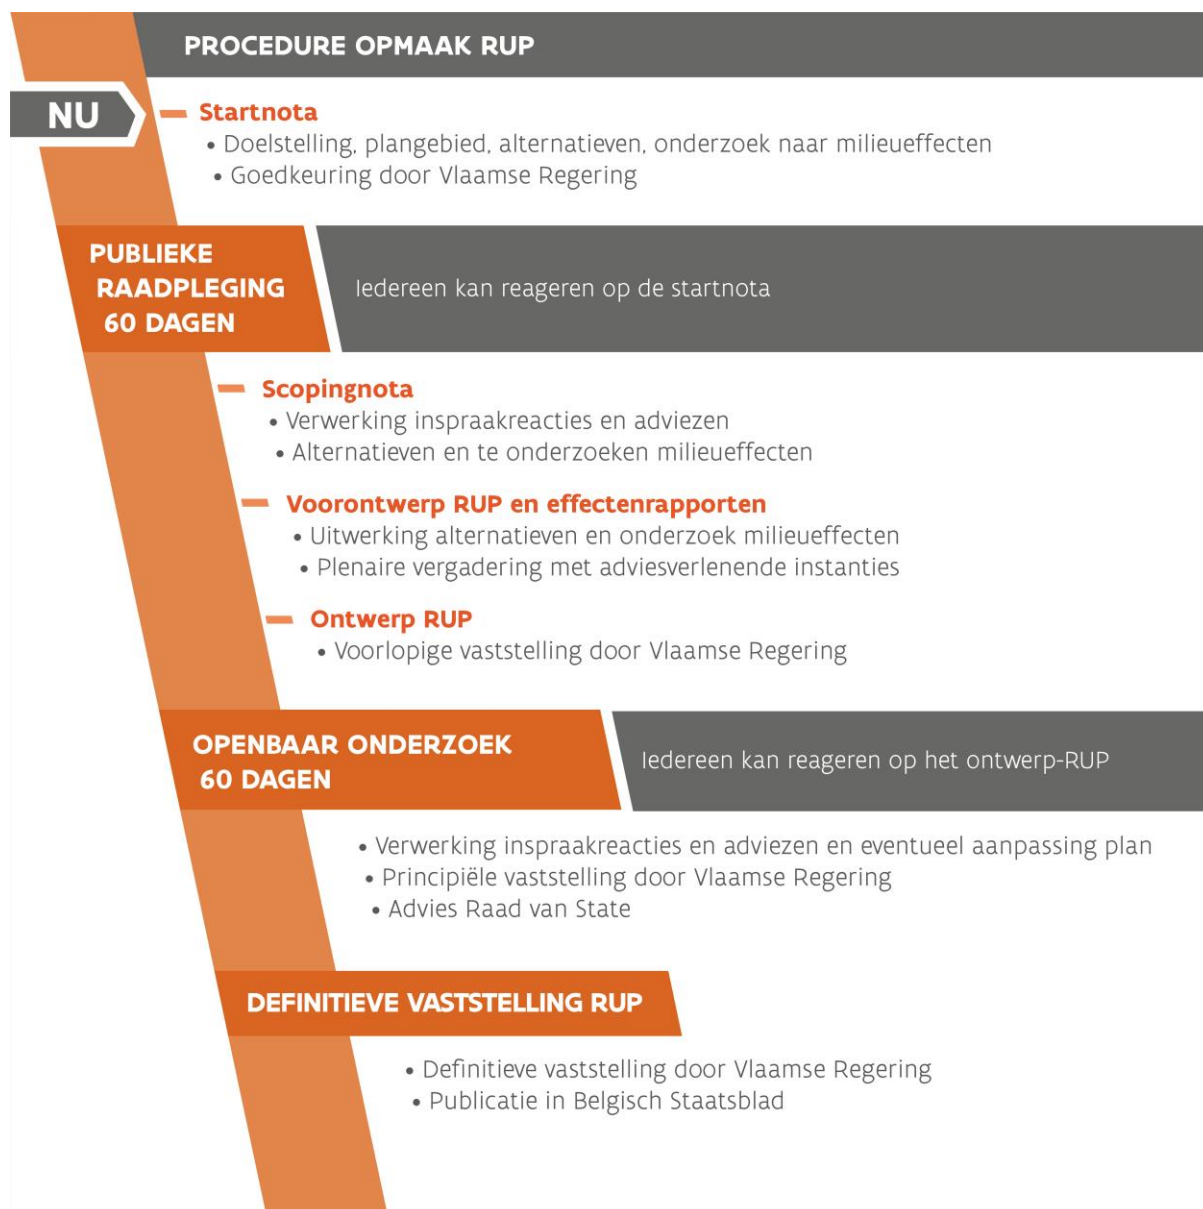

## 2.1 Opstartfase

### 2.1.1 Doelstelling – onderzoek

In deze fase wordt ingezet op het helder krijgen van de plandoelstellingen, het planvoornemen en de te onderzoeken alternatieven. Het team voor de milieubeoordeling wordt aangeduid en de aspecten van de scoping worden bepaald. De scoping is de eerste fase bij het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) waarbij de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER worden vastgelegd.

### 2.1.2 Overleg- en participatie - timing

In de periode september - december 2022 kwam het planteam tweewekelijks samen om gezamenlijk de startnota en procesnota 1 uit te schrijven. Dit overleg werd, waar nodig, aangevuld met Elia. De start- en procesnota 1 vormen als dusdanig een weerslag van deze overlegmomenten.

Op 21 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen het planteam en de gemeenten Avelgem en Kluisbergen. Op dit overleg was Elia eveneens aanwezig in functie van het beantwoorden van specifieke technische vragen. Op dit overleg werden de plandoelstellingen en mogelijke alternatieven (corridors) besproken. In navolging van deze bespreking werd op 28 november een draft startnota aan de gemeenten overgemaakt voor opmerkingen. De gemeenten hebben als reactie op de draft startnota hun bezorgheid geuit over die corridors/alternatieven die gepaard gaan met het bijkomend overspannen van woningen.

Op 2 maart werd opnieuw met de gemeenten overlegd met betrekking tot de compensatiegebieden. De suggesties van de gemeenten werden meegenomen in de voorliggende startnota.

De Vlaamse Regering keurde de startnota goed op XXX.

De Vlaamse Regering organiseert een publieke raadpleging over de startnota van xxx 2023 tot en met xxx 2023. Tijdens deze periode kan iedereen reacties indienen op de startnota: reacties op de plandoelstelling en het planvoornemen, op de alternatieven of op de wijze waarop de milieueffecten onderzocht zullen worden. Lokale overheden en administraties worden om een formeel advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd.

De kennisgeving omvat wettelijk:

- De aankondiging van de terinzagelegging in de media;
- Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota 1 en bijlagen) gedurende 60 dagen, op <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lusvanhenegouwen>, bij het departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen (Avelgem en Kluisbergen);
- Een participatiemoment onder de vorm van een informatiemarkt/webinar op xx maand 2023 waarop het planteam toelichting geeft bij de startnota.

Daarnaast wordt als bijkomende communicatie voorzien:

- Een projectpagina waarop alle informatie wordt gebundeld:  
<https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lusvanhenegouwen>;
- Een ingesproken presentatie, te beluisteren via de projectpagina;
- Aankondiging via de kanalen van de gemeenten;

- Aankondiging via een persbericht;
- Aankondiging via een digitale nieuwsbrief, inschrijven kan via de projectpagina;
- Verspreiding van een flyer met bekendmaking van de publieke raadpleging;
- Een contactpunt: [omgevingsplanning@vlaanderen.be](mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be) of T 02 553 38 00.

Het resultaat van de participatie wordt opgenomen in een verslag, dat toegevoegd wordt aan de projectpagina.

### 2.1.3 Documenten

Hier vindt u een olijsting van alle beschikbare documenten in deze fase:

- Procesnota 1;
- Startnota.

## 2.2 Scopingfase

### 2.2.1 Doelstelling – onderzoek

In deze fase worden alle adviezen en inspraakreacties op de startnota door het planteam verwerkt tot een scopingnota. In de scopingnota kunnen suggesties opgenomen worden om het plan te verbeteren of aandachtspunten voor de effectenonderzoeken. Hierbij wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de adviezen en inspraakreacties.

De scopingnota bevat de plandoelstellingen, het planvoornemen, de te onderzoeken alternatieven en geeft de reikwijdte en het detailniveau van het op te maken plan-MER aan.

Met de scopingnota kan de opmaak van het voorontwerp GRUP en het milieueffectenonderzoek starten.

Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota versie 2 opgemaakt.

De scopingnota zal zo het voortschrijdend inzicht tussen de startfase en de fase van voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP weergeven en zal ook aangeven hoe is omgegaan met de adviezen en de inspraakreacties.

### 2.2.2 Overleg- en participatie

In deze fase zal onder andere op basis van de inspraakreacties op de startnota gekeken worden welke overlegmomenten, naast de planteamvergaderingen, wenselijk en nodig zijn om een gedragen scopingnota te bekomen.

De scopingnota is een publiek document, maar hierover wordt geen participatieronde georganiseerd. Ze kan ingekeken worden via de projectpagina. De betrokken actoren en geïnteresseerden worden geïnformeerd via :

- Een digitale nieuwsbrief;
- De projectpagina <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lusvanhenegouwen>;
- Het contactpunt blijft actief: [omgevingsplanning@vlaanderen.be](mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be) of T 02 553 38 00.

### 2.2.3 Timing

Deze fase vangt aan na de publieke raadpleging over de startnota (van xxx 2023 tot en met xxx 2023) en eindigt bij afronding van de scopingnota en procesnota 2 (najaar 2023).

### 2.2.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Scopingnota;
- Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment;
- Procesnota 02.

## 2.3 Ontwerp planvormingsfase

### 2.3.1 Doelstelling – onderzoek

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering. De plenaire vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten van de uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties.

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerde planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen. Alternatieven worden onderzocht op hun ruimtelijke en andere effecten. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de beoordelingen of kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd (altijd onderbouwd met effectbeoordelingen).

Indien daartoe de noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. De nieuwe versie is ook een publiek document, dat kan ingekeken worden via de projectpagina.

Indien de scope van het plan in de loop van het proces substantieel wijzigt (bv. nieuwe alternatieven die voorgesteld worden, een uitbreiding van het plangebied ...), moet nagegaan worden of er een (nieuwe) raadpleging georganiseerd moet worden.

In deze fase wordt procesnota versie 3 opgemaakt.

### 2.3.2 Overleg-en participatie

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een onderbouwd en gedragen ontwerp GRUP te kunnen opmaken.

### 2.3.3 Timing

Vermoedelijk zal de plenaire vergadering in het najaar van 2023 georganiseerd worden.

### 2.3.4 Documenten

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het voorontwerp GRUP met inbegrip van het Ontwerp milieueffectenbeoordeling;

- Verslag plenaire vergadering;
- Procesnota 03

## **2.4 Planvormingsfase**

### **2.4.1 Doelstelling – onderzoek**

Op basis van de adviezen uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering worden het voorontwerp GRUP en de ontwerp milieueffectenbeoordeling verder afgewerkt tot het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling.

Deze fase eindigt bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP door de Vlaamse Regering en de organisatie van het openbaar onderzoek.

### **2.4.2 Overleg-en participatie**

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp-GRUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling. Tijdens deze periode van 60 dagen kan iedereen inspraakreacties indienen. Lokale overheden en administraties worden om een formeel advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd.

De kennisgeving omvat wettelijk:

- De aankondiging van de terinzagelegging in de media;
- Een terinzagelegging van het dossier gedurende 60 dagen, op <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/lusvanhenegouwen>, bij het departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen (Avelgem en Kluisbergen);
- Een participatiemoment waarop het planteam toelichting geeft bij de startnota.

Daarnaast wordt bijkomende communicatie voorzien, vergelijkbaar met de communicatie naar aanleiding van de publieke raadpleging over de startnota.

### **2.4.3 Timing**

De voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk in het najaar van 2023 gebeuren, waarna het openbaar onderzoek rond de jaarwisseling kan georganiseerd worden.

### **2.4.4 Documenten**

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Procesnota 04.

## **2.5 Goedkeuringsfase**

### **2.5.1 Doelstelling – onderzoek**

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. Team Mer van de Vlaamse overheid zal voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het GRUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast.

### **2.5.2 Overleg-en participatie**

De mate en manier waarop in deze fase overleg en / of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen worden.

### **2.5.3 Timing**

De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk plaatsvinden rond de zomer van 2024.

### **2.5.4 Documenten**

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Procesnota 5.

### 3 Bijlagen

#### 3.1 Verslagen van planteam

In de periode september 2022- maart 2023 kwam het planteam tweewekelijks samen om gezamenlijk de startnota en procesnota 1 uit te schrijven. Dit overleg werd, waar nodig, aangevuld met Elia. De start- en procesnota 1 vormen als dusdanig een weerslag van deze overlegmomenten.

#### VERSLAG

////////////////////////////////////  
Datum: 1 februari 2023  
Aanwezig: Griet De Mulder, Christine Daniels, Melanie Franck, Mart Verlaek, Michel Goethals (dept Omg), Claerbout Sofie (Antea)  
Aanwezig voor een gedeelte van de vergadering: Steven Mertens (Elia)  
Onderwerp: Planteam: Geïntegreerd planningsproces Lus van Henegouwen  
////////////////////////////////////

#### Agenda:

- Voorbereiding inspraakperiode

#### Vorbereiding inspraakperiode

De startnota met bijlagen is overgemaakt aan de Vlaamse Regering met het oog op beslissing. Het planteam start nu met de voorbereiding van de inspraakperiode. Het planteam overloopt het draaiboek en de retroplanning die zijn opgemaakt door Connect. Er worden afspraken gemaakt over het aanleveren van insteken voor de flyer, de panelen van de infomarkt en de ingesproken powerpoint.

#### VERSLAG

////////////////////////////////////  
Datum: 6 februari 2023  
Aanwezig: Griet De Mulder, Christine Daniels, Melanie Franck, Mart Verlaek, Michel Goethals (dept Omg), Claerbout Sofie (Antea)  
Aanwezig voor een gedeelte van de vergadering: Steven Mertens (Elia)  
Onderwerp: Planteam: Geïntegreerd planningsproces Lus van Henegouwen  
////////////////////////////////////

#### Agenda:

- Voorbereiding inspraakperiode

#### Vorbereiding inspraakperiode

In navolging van het draaiboek en de retroplanning wordt de draft van panelen voor de informarkt besproken. Er worden verdere afspraken gemaakt over het aanleveren van insteken.

## VERSLAG

////////////////////////////////////  
Datum: 15 februari 2023

Aanwezig: Griet De Mulder, Christine Daniels, Melanie Franck, Mart Verlaek, Michel Goethals (dept Omg), Claerbout Sofie (Antea)

Aanwezig voor een gedeelte van de vergadering: Steven Mertens (Elia)

Onderwerp: Planteam: Geïntegreerd planningsproces Lus van Henegouwen  
////////////////////////////////////

### Agenda:

- Stand van zaken
- Compensatieregeling

### Stand van zaken

Gelet op de afgeleverde omgevingsvergunning 'TR42730/C-150-RUIEN-THIEULAIN', waar als voorwaarde is opgenomen dat de bestaande bovengrondse leidingen en masten na aanleg en ingebruikname van de nieuwe ondergrondse kabels worden afgebroken, vormt corridor 2 niet langer een relevant alternatief volgens de ruimtelijke principes.

### Compensatieregeling

Met het oog op het Verzameldecreet, waarvan de in werking treding rond de zomer verwacht wordt, lijkt het aangewezen om in de startnota reeds een compensatietoets op te nemen. Daartoe zal contact worden opgenomen met de betrokken gemeentes.

## VERSLAG

////////////////////////////////////  
Datum: 6 maart 2023

Aanwezig: Griet De Mulder, Christine Daniels, Melanie Franck, Mart Verlaek, Michel Goethals (dept Omg), Claerbout Sofie (Antea)

Aanwezig voor een gedeelte van de vergadering: Steven Mertens, Jeroen Mentens (Elia)

Onderwerp: Planteam: Geïntegreerd planningsproces Lus van Henegouwen  
////////////////////////////////////

### Agenda:

- Compensatieregeling
- Voorbereiding inspraakperiode

### Compensatieregeling

Met het oog op het Verzameldecreet, waarvan de in werking treding rond de zomer verwacht wordt, lijkt het aangewezen om in de startnota reeds een compensatietoets op te nemen. In navolging van een gesprek met de gemeentes komt een aanpalend woonuitbreidingsgebied in beeld. Een andere zone die verder kan onderzocht worden, zijn de als gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen bestemde zones in het kader van het waterwingebied. De startnota zal op dit punt aangevuld worden.

### Voorbereiding inspraakperiode



In navolging van het draaiboek en de retroplanning wordt de bijgewerkte draft van panelen voor de informmarkt besproken.
