



# Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herinrichting Complex E40 Drongen'

**Procesnota 1 (startfase)**

## Inhoud

1	Historiek.....	4
2	Opmaak GRUP en wegontwerp.....	5
3	Overlegstructuur .....	6
3.1	Planteam .....	6
3.2	Begeleidingsgroep.....	7
3.3	Toetsingsmomenten .....	7
3.4	Ontwerpateliers .....	7
3.5	Vlaamse Regering beslist .....	8
4	Procesverloop en -aanpak GRUP .....	9
4.1	Opstartfase.....	10
4.1.1	Doelstelling – onderzoek.....	10
4.1.2	Overleg- en participatie .....	10
4.1.3	Documenten .....	11
4.2	Scopingfase .....	11
4.2.1	Doelstelling – onderzoek.....	11
4.2.2	Overleg- en participatie .....	11
4.2.3	Timing.....	12
4.2.4	Documenten .....	12
4.3	Ontwerp planvormingsfase.....	12
4.3.1	Doelstelling – onderzoek.....	12
4.3.2	Overleg-en participatie .....	12
4.3.3	Timing.....	13
4.3.4	Documenten .....	13
4.4	Planvormingsfase.....	13
4.4.1	Doelstelling – onderzoek.....	13
4.4.2	Overleg-en participatie .....	13
4.4.3	Timing.....	14
4.4.4	Documenten .....	14
4.5	Goedkeuringsfase .....	14
4.5.1	Doelstelling – onderzoek.....	14
4.5.2	Overleg-en participatie .....	14
4.5.3	Timing.....	14
4.5.4	Documenten .....	14

# Procesnota

Dit document is de procesnota 1 bij de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Herinrichting Complex E40 Drogen' op grondgebied van Gent.

De procesnota beschrijft de aanpak van het proces in elke fase. Het is een informatief document, dat bij elke fase in het planningsproces geactualiseerd wordt.

In deze procesnota, opgemaakt bij de opstart van het planproces, vindt u een overzicht van het proces en overleg in de reeds doorlopen opstartfase. Daarnaast geeft deze procesnota aan welke volgende stappen voorzien zijn. Per fase van het proces wordt aangegeven wat de doelstelling van de fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin zullen worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke inspraak- en participatiemomenten u mag verwachten.

In deze procesnota zijn enkel het procesverloop en de procesaanpak terug te vinden. Voor alle inhoudelijke informatie over het GRUP verwijzen we naar de startnota die in deze fase samen met de procesnota raadpleegbaar is.

Met deze eerste procesnota en de bijhorende startnota start de Vlaamse overheid het planproces voor de concrete uitwerking van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan formeel op.

## **Contact en info:**

Departement Omgeving

[omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drogen](https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drogen)

Email: [omgevingsplanning@vlaanderen.be](mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be)

Telefoonnummer: 02 553 38 00

Adres: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel

# 1 Historiek

De intentie om het complex Drongen her in te richten en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I te verbeteren, is niet nieuw. Het plan kent reeds een lange historiek.

In 1999 werd een verkeersleefbaarheidsplan opgesteld voor Drongen, waarbij men aan de hand van de probleemstelling een verbetering van het complex, de ontsluiting en de doortocht beoogde. Doorheen de tijd (2011 tot 2021) werden verschillende stappen gezet. Er werd ingezet op een grondige probleem- en contextanalyse en concretisering van de probleemstelling, ontwerpend onderzoek E40 Drongen-Baarle, verkeersonderzoek en de opmaak en afronding van een plan-MER (2019).

Intussen was de wetgeving rond de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en de hiermee gepaard gaande milieuwetgeving gewijzigd en werd de problematiek van het complex Drongen inhoudelijk bijgesteld. De scope werd verengd van complex, ontsluitingsweg bedrijventerrein en omleidingsweg naar enkel complex. Daarom besliste de Vlaamse overheid, departement Omgeving, in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), samen met het betrokken bestuur, stad Gent, om op basis van het reeds gevoerde onderzoek en rekening houdend met de gewijzigde inzichten een nieuw planningsproces op te starten.

Dit resulteerde in de goedkeuring van de startnota voor de opmaak van het GRUP 'Omgeving Complex E40-N466 Drongen' door de Vlaamse Regering op 4 juni 2021. Dit GRUP had als doel de herinrichting van het op- en afrittencomplex E40-N466 Drongen en de reorganisatie van de wegen die aansluiten op het complex, met maatregelen om de omgeving rond het complex te verbeteren. De publieke raadpleging over de startnota voor het GRUP 'Complex E40-N466 Drongen' liep van 17 augustus tot 15 oktober 2021.

In dezelfde omgeving liep ook de opmaak van het GRUP 'Booiebos'. De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP 'Booiebos' op het grondgebied van Deinze en Gent. Dit GRUP had als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden in uitvoering van het planologisch attest verleend aan de bedrijven Carrosserie Matthys, Funico, Nuscience Belgium en Willemen Infra, met aandacht voor de buffering naar de omgeving en de ontsluiting voor het vrachtverkeer. De publieke raadpleging over de startnota voor het GRUP 'Booiebos' liep van 2 februari tot 2 april 2021.

Na verwerking van de inspraakreacties uit de publieke raadpleging over de startnota's voor beide GRUP's, besliste de Vlaamse Regering op 20 mei 2022 om beide planprocessen stop te zetten en een nieuw geïntegreerd planproces op te starten voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E40-N466 Drongen met reorganisatie van de wegen die erop aansluiten en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I naar dit complex. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen beide dossiers is immers groot. De doelstellingen en alternatieven werden opnieuw bekeken vanuit de gezamenlijke problematiek van beide dossiers. Daarbij werden de inspraakreacties en verbetervoorstellen uit beide planprocessen mee afgewogen. Hierdoor kunnen nieuwe kansen gecreëerd worden voor een positief en beter project met ruimte voor de inbreng van de verschillende stakeholders.

De Vlaamse Regering keurde de startnota voor het GRUP 'Complex E40 Drongen' goed op **XX oktober 2022**. De doelstellingen, alternatieven en aanpak van het milieuonderzoek zijn beschreven in de startnota. De optimalisatie van het bedrijventerrein Drongen I (Booiebos) is niet meer opgenomen in dit GRUP. Hiervoor wordt op korte termijn een afzonderlijk GRUP opgestart.

## 2 Opmaak GRUP en wegontwerp

Het GRUP 'Herinrichting Complex E40 Drogen' legt de contour en de toekomstige bestemmingen en voorschriften vast van het gebied waarbinnen het nieuwe op- en afrittencomplex E40-N466 en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drogen I (Booiebos) zullen vallen. Het GRUP wordt opgemaakt omdat er op de huidige plannen geen ruimte is voor een herinrichting van het verkeerscomplex en voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Het GRUP vormt de juridische basis voor het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer om later de vergunning voor de werken aan te vragen.

Het plangebied in de startnota geeft de maximale contour aan waarbinnen op dit moment wordt verwacht dat de plandoelstellingen gerealiseerd kunnen worden en waarbinnen het onderzoek zal gebeuren. Deze contour omvat zowel de ruimte voor de wegen als de ruimte nodig voor bijkomende milderende maatregelen of compensaties. Deze contour zal, op basis van het wegontwerp, in de loop van het planproces worden verfijnd en kan dus in het definitieve GRUP kleiner zijn dan de huidige contour in de startnota.


De uitwerking van het wegontwerp loopt parallel met de opmaak van het GRUP. De opmaak van het wegontwerp zal worden begeleid door een projectstuurgroep samengesteld uit het Departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Gent en afhankelijk van het project ook De Lijn, Infrabel, de waterbeheerder. De projectstuurgroep neemt de beslissingen in elke fase van het wegontwerp.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal over de opmaak van het wegontwerp overleg organiseren met de direct betrokken actoren. Hiervoor zal gewerkt worden met ontwerpateliers.

Parallel met de opmaak van het GRUP wordt een plan-milieueffectenrapport of plan-MER gemaakt. Vandaar de naam 'geïntegreerd planningsproces'. Het plan-MER onderzoekt de verwachte effecten door de realisatie van de nieuwe bestemmingen.

Na de definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering werkt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegontwerp verder uit. Daarbij worden de milieueffecten opnieuw onderzocht, nu op projectniveau via een project-MER.

### 3 Overlegstructuur

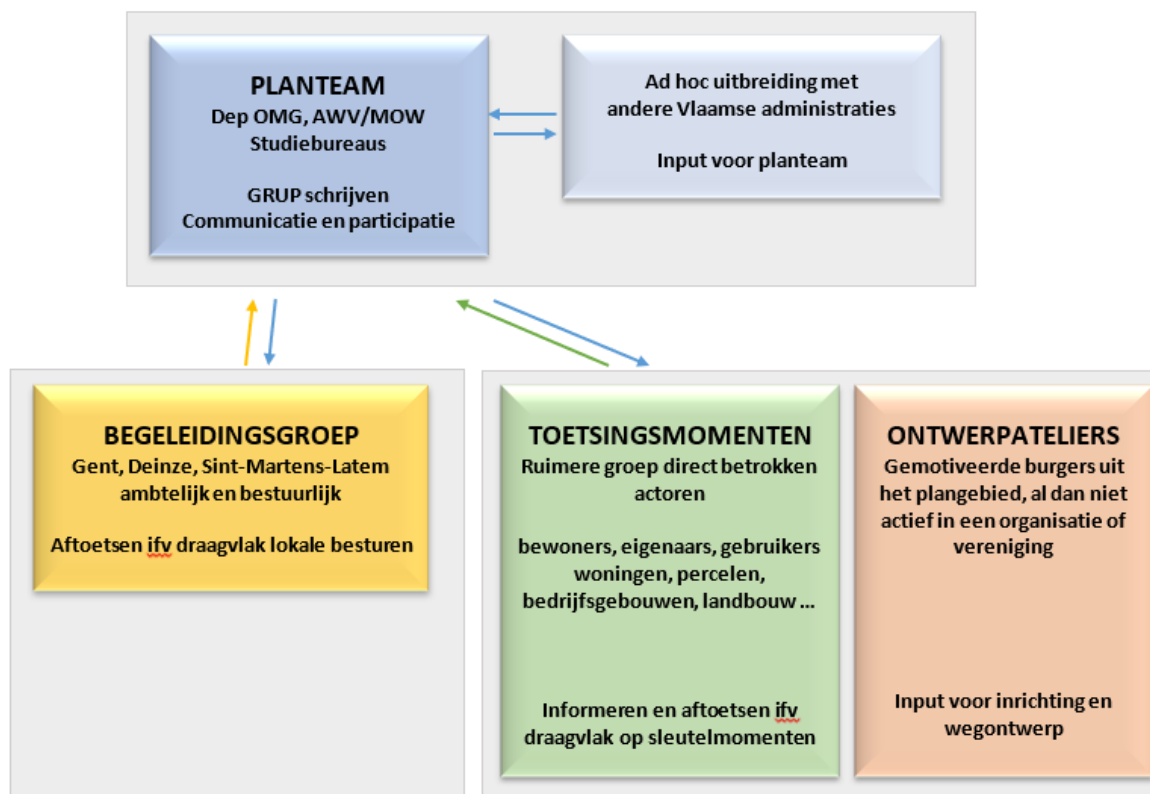

#### 3.1 Planteam

Het planteam staat in voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces. Het planteam neemt dus de globale verantwoordelijkheid voor het planproces op zich: uiteenzetten van het plan, begeleiden van de onderzoeken, overleg, organiseren van het openbaar onderzoek en de communicatie en participatiemomenten, integreren van de tussentijdse resultaten in het planningsproces, opmaken van documenten en verslagen met verwerking van opmerkingen en bezwaren, continue kwaliteitsbewaking, enzovoort.

Het planteam bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Departement Omgeving (inclusief team MER)
- Departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer

Waar nodig wordt het planteam ondersteund door externe deskundigen. Goedele Schuerman van DenS Communicatie ondersteunt het planteam voor het luik van de communicatie en participatie. Daarnaast zijn deskundigen van Tractebel aangesteld voor de feitelijke opmaak van de milieubeoordeling.

Wanneer dat nodig is voor de inhoudelijke onderbouwing kan het planteam ad hoc uitgebreid worden met andere Vlaamse administraties om zo de nodige input te verzamelen. Gezien de nabijheid van de Leie en de Keuzemeersen denken we daarbij aan het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij. In het kader van de ontsluiting van het bedrijventerrein Drogen I kan mogelijk ook Vlaio betrokken worden.

Voorliggende startnota en procesnota zijn het resultaat van de vergaderingen van het planteam. Het planteam moet gezien worden als het schrijfteam, het vergadert regelmatig.

Het planteam werkt in opdracht van de Vlaamse Regering die de formele beslissingen neemt in het planproces voor het GRUP 'Herinrichting Complex E40 Drongen' (zie 3.5 en Procesverloop en -aanpak).

### **3.2 Begeleidingsgroep**

De voorstellen en documenten voorbereid door het planteam worden afgetoetst aan de betrokken lokale besturen via de begeleidingsgroep.

De begeleidingsgroep bestaat uit ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van:

- Stad Gent
- Stad Deinze
- Gemeente Sint-Martens-Latem

De alternatieven in de startnota liggen op grondgebied van Gent. In de begeleidingsgroep worden ook Deinze en Sint-Martens-Latem opgenomen omwille van de nabijheid. Het bedrijventerrein Drongen I is gelegen op het grondgebied van Gent en Deinze (Nevele). Sint-Martens-Latem grenst met de Leievallei aan het plangebied.

Tijdens de formele adviesmomenten (zie Procesverloop en -aanpak) worden de lokale besturen ook om een formeel advies gevraagd.

### **3.3 Toetsingsmomenten**

Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor informatie, communicatie en overleg met alle betrokkenen, bewoners en gebruikers.

Op sleutelmomenten bij de opmaak van het GRUP worden zij betrokken via de globale projectcommunicatie, aangevuld met extra informatie voor de direct betrokken actoren.

Op sleutelmomenten zijn ook formele participatiemomenten voorzien.

- Een eerste formeel participatiemoment in het kader van het geïntegreerde planningsproces is de publieke raadpleging over de startnota, in een vroege fase van het proces.
- Een tweede formeel participatiemoment is het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling.

De concrete aanpak van de communicatie, de adviesrondes en alle voorziene inspraak- en communicatiemomenten is opgenomen onder 'Procesverloop en -aanpak' in deze procesnota.

### **3.4 Ontwerpateliers**

Het planteam zoekt zoveel mogelijk naar gedragen oplossingen. Specifiek voor de inrichting en het wegontwerp zullen ontwerpateliers georganiseerd worden met gemotiveerde burgers uit het plangebied, al dan niet actief in een organisatie of vereniging.

### **3.5 Vlaamse Regering beslist**

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereist ook beslismomenten. De concrete en formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 'Herinrichting Complex E40 Drongen' worden genomen door de Vlaamse Regering.

De eerste stap in het beslissingsproces is de goedkeuring van de startnota. Daarmee zet de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.


Na de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering daarna ook beslissen over het ontwerp GRUP en over het definitieve GRUP.



## 4 Procesverloop en -aanpak GRUP

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. Elk proces vereist immers specifiek en aanpast overleg en onderzoeken. De regelgeving, in dit geval de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO), legt niet vast hoe vaak er vergaderd moet worden of welke onderzoeksgegevens minimaal vereist zijn.

De VCRO legt wel een kader en spelregels vast. Elk planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases.

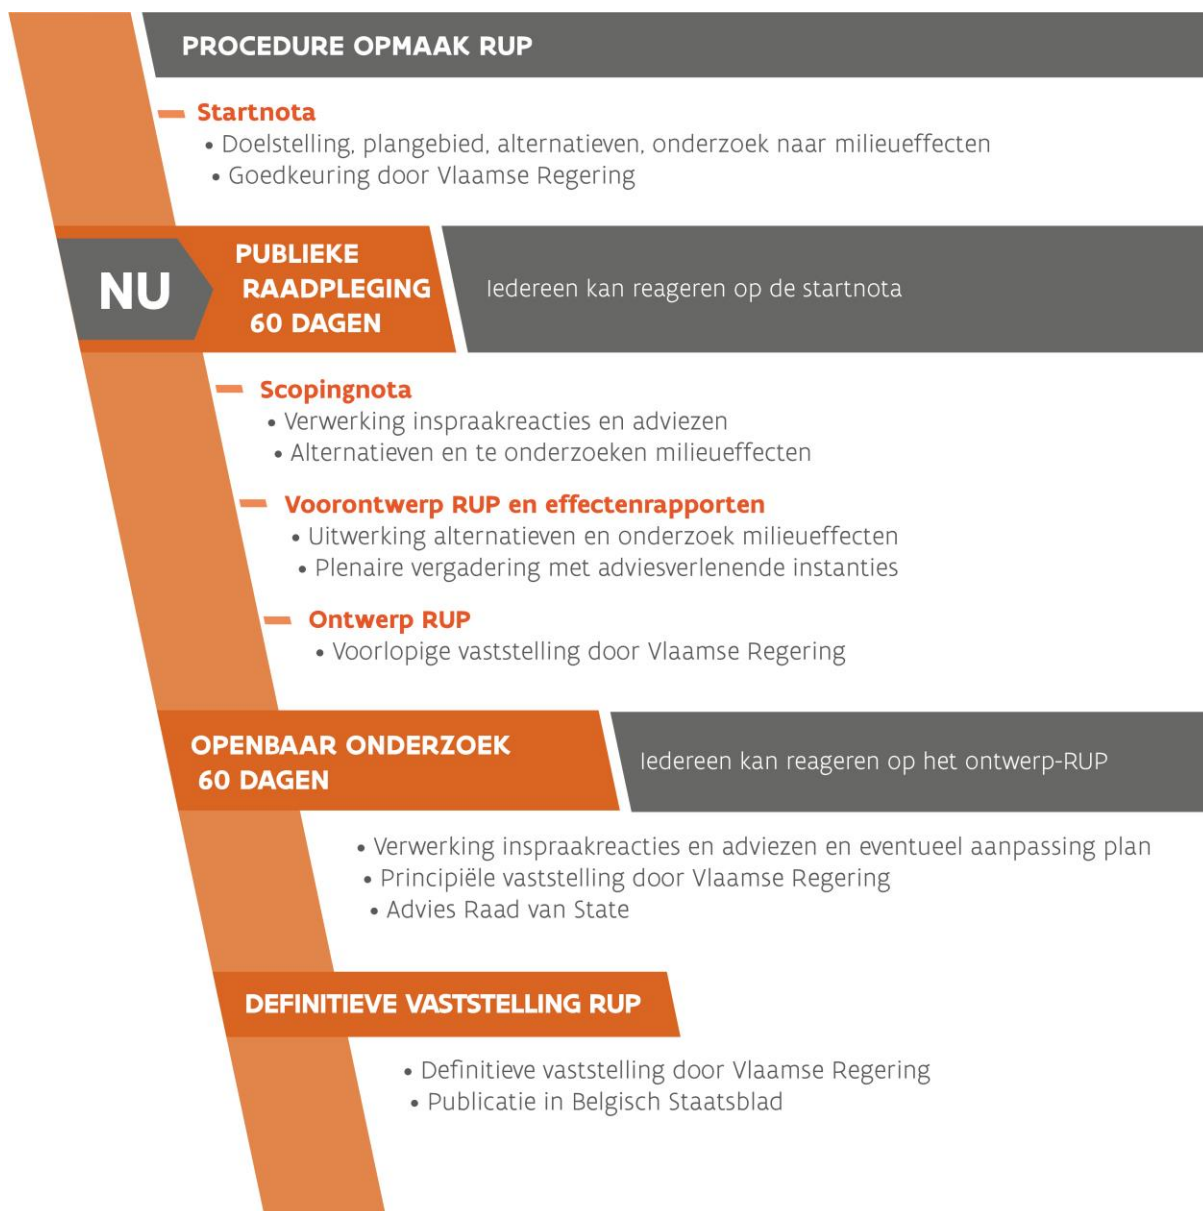

## 4.1 Opstartfase

### 4.1.1 Doelstelling – onderzoek

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent concreet: het planteam samenstellen en de startnota en procesnota 1 opmaken.

In deze fase wordt ingezet op het helder krijgen van de plandoelstellingen en de te onderzoeken alternatieven. Het team voor de milieubeoordeling wordt aangeduid en de aspecten van de scoping worden bepaald. De scoping is de eerste fase bij het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) waarbij de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER worden vastgelegd.

### 4.1.2 Overleg- en participatie

Het geïntegreerde planningsproces is opgestart met een overleg op 17 juni 2022 waarop de planteam van de stopgezette GRUP's 'Complex E40-N466 Drogen' en 'Booiebos' en de gemeente Sint-Martens-Latem waren uitgenodigd, waarna het planteam en de begeleidingsgroep zijn samengesteld.

In de periode juni - september 2022 werkte het planteam de startnota en procesnota 1 uit.

Het planteam is samengekomen op volgende data:

- 29 juni 2022
- 26 augustus 2022
- 7 september 2022
- 14 september 2022
- 20 september 2022

De startnota en procesnota werden teruggekoppeld naar de begeleidingsgroep op 23 september 2022.

De Vlaamse Regering keurde de startnota goed op **XX oktober 2022**.

De Vlaamse Regering organiseert een publieke raadpleging over de startnota **van XX tot en met XX**. Tijdens deze periode kan iedereen reacties indienen op de startnota: reacties op de plandoelstelling en het planvoornemen, op de alternatieven of op de wijze waarop de milieueffecten onderzocht zullen worden. Lokale overheden en administraties worden om een formeel advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd.

De kennisgeving omvat wettelijk:

- De aankondiging van de terinzagelegging in de media;
- Een terinzagelegging van het dossier (startnota en procesnota 1 en bijlagen) gedurende 60 dagen, op <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drogen>, bij het departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen. Het dossier zal ter inzage gelegd worden in Gent, Deinze en Sint-Martens-Latem;
- Een participatiemoment onder de vorm van twee informatiemarkten **op xx en xx november 2022** waarop het planteam toelichting geeft bij de startnota.

Daarnaast wordt als bijkomende communicatie voorzien:

- Een projectpagina waarop alle informatie wordt gebundeld, <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drogen> ;

- Een ingesproken presentatie, te beluisteren via de projectpagina;
- Aankondiging via de kanalen van de gemeenten;
- Aankondiging via een persbericht;
- Aankondiging via een digitale nieuwsbrief, inschrijven kan via de projectpagina;
- Verspreiding van een flyer met bekendmaking van de publieke raadpleging;
- Een contactpunt: [omgevingsplanning@vlaanderen.be](mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be) of T 02 553 38 00.

Het resultaat van de participatie wordt opgenomen in een verslag, dat toegevoegd wordt aan de projectpagina.

### 4.1.3 Documenten

Hier vindt u een olijsting van alle beschikbare documenten in deze fase:

- Procesnota 1;
- Startnota;
- Bijlage 1 Alternatievennota;
- Bijlage 2 Nota verwerking inspraakreacties afgesloten GRUP's
- Bijlage 3 RVR-toets.

## 4.2 Scopingfase

### 4.2.1 Doelstelling – onderzoek

In deze fase worden alle adviezen en inspraakreacties op de startnota door het planteam verwerkt tot een scopingnota. In de scopingnota kunnen suggesties opgenomen worden om het plan te verbeteren of aandachtspunten voor de effectenonderzoeken. Hierbij wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de adviezen en inspraakreacties.

De scopingnota bevat de plandoelstellingen, de te onderzoeken alternatieven en geeft de reikwijdte en het detailniveau van het op te maken plan-MER aan.

Met de scopingnota kan de opmaak van het voorontwerp GRUP en het milieueffectenonderzoek starten.

Naast de scopingnota wordt in deze fase ook procesnota versie 2 opgemaakt.

### 4.2.2 Overleg- en participatie

In deze fase zal onder andere op basis van de inspraakreacties op de startnota gekeken worden welke overlegmomenten, naast de planteamvergaderingen, wenselijk en nodig zijn om een gedragen scopingnota te bekomen.

De scopingnota is een publiek document, maar hierover wordt geen participatieronde georganiseerd. Ze kan ingekeken worden via de projectpagina. De betrokken actoren en geïnteresseerden worden geïnformeerd via :

- Een digitale nieuwsbrief;
- De projectpagina <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drongen> ;
- Aankondiging via de kanalen van de gemeenten;
- Het contactpunt blijft actief: [omgevingsplanning@vlaanderen.be](mailto:omgevingsplanning@vlaanderen.be) of T 02 553 38 00.

Parallel met de opmaak van het GRUP, loopt ook het studiewerk voor de uitwerking van het wegontwerp. In het kader van de verdere technische uitwerking van het project zullen er uiteraard ook overlegmomenten worden georganiseerd met de betrokken actoren en instanties.

### **4.2.3 Timing**

Deze fase vangt aan na de publieke raadpleging over de startnota (van XX tot en met XX) en eindigt bij afronding van de scopingnota en procesnota 2 (vermoedelijk april 2023).

### **4.2.4 Documenten**

In deze fase worden minimaal volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Scopingnota;
- Verslag van de publieke raadpleging en het participatiemoment;
- Procesnota 2.

## **4.3 Ontwerp planvormingsfase**

### **4.3.1 Doelstelling – onderzoek**

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, waarbij de resultaten van de uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen.

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerde planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen. Alternatieven worden onderzocht op hun ruimtelijke en andere effecten en getoetst aan de doelstellingen van het plan. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven verlaten worden op basis van de beoordelingen of kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd (altijd onderbouwd met effectbeoordelingen).

Indien daartoe de noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. De nieuwe versie is ook een publiek document, dat kan ingekeken worden via de projectpagina.

Indien de scope van het plan in de loop van het proces substantieel wijzigt, moet nagegaan worden of er een (nieuwe) raadpleging georganiseerd moet worden.

In deze fase wordt procesnota versie 3 opgemaakt.

### **4.3.2 Overleg-en participatie**

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een onderbouwd en gedragen ontwerp GRUP te kunnen opmaken.

Daarnaast zullen in deze fase ook overlegmomenten doorgaan in het kader van de verdere technische uitwerking van het globale project en van het wegontwerp.

De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering met de adviesinstanties (de lokale overheden en administraties) over het voorontwerp-GRUP met de ontwerp-milieueffectenbeoordeling. De plenaire vergadering dient om het ontwerpplan waarbij de resultaten

van de uitgevoerde effectenbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken met de adviesinstanties.

### **4.3.3 Timing**

Vermoedelijk zal de plenaire vergadering in het najaar van 2023 georganiseerd worden.

### **4.3.4 Documenten**

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het voorontwerp GRUP met inbegrip van de ontwerp milieueffectenbeoordeling;
- Procesnota 3, met verslag van de plenaire vergadering.

## **4.4 Planvormingsfase**

### **4.4.1 Doelstelling – onderzoek**

Op basis van de adviezen uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering worden het voorontwerp GRUP en de ontwerp milieueffectenbeoordeling verder afgewerkt tot het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling.

Indien daartoe de noodzaak zou bestaan, kan het planteam ook tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. De nieuwe versie is ook een publiek document, dat kan ingekeken worden via de projectpagina.

Indien de scope van het plan in de loop van het proces substantieel wijzigt, moet nagegaan worden of er een (nieuwe) raadpleging of plenaire vergadering georganiseerd moet worden.

Deze fase eindigt bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp-GRUP door de Vlaamse Regering en de organisatie van het openbaar onderzoek.

### **4.4.2 Overleg-en participatie**

De Vlaamse Regering stelt het ontwerp-GRUP voorlopig vast en organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP en de milieueffectenbeoordeling. Tijdens deze periode van 60 dagen kan iedereen inspraakreacties indienen. Lokale overheden en administraties worden om een formeel advies gevraagd. Tijdens de publieke raadpleging wordt een participatiemoment georganiseerd.

De kennisgeving omvat wettelijk:

- De aankondiging van de terinzagelegging in de media;
- Een terinzagelegging van het dossier (ontwerp-GRUP en procesnota 4 en bijlagen) gedurende 60 dagen, op <https://omgeving.vlaanderen.be/grups/complex-E40-drongen>, bij het departement Omgeving en bij de betrokken lokale besturen. Het dossier zal ter inzage gelegd worden in Gent, Deinze en Sint-Martens-Latem;
- Een participatiemoment waarop het planteam toelichting geeft bij het ontwerp-GRUP.

Daarnaast wordt bijkomende communicatie voorzien, vergelijkbaar met de communicatie naar aanleiding van de publieke raadpleging over de startnota.

### **4.4.3 Timing**

De voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk in december 2023 gebeuren, waarna het openbaar onderzoek kan georganiseerd worden, voorjaar 2024.

### **4.4.4 Documenten**

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het ontwerp GRUP met inbegrip van de milieubeoordeling;
- Procesnota 4, met verwerking van de adviezen uitgebracht n.a.v. de plenaire vergadering.

## **4.5 Goedkeuringsfase**

### **4.5.1 Doelstelling – onderzoek**

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve GRUP en de milieubeoordeling opgemaakt. De Vlaamse Regering keurt het plan daarop definitief goed. Team Mer van de Vlaamse overheid zal voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het GRUP de kwaliteit van de milieubeoordeling beoordelen. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een milieubeoordeling moet omvatten en zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast.

### **4.5.2 Overleg-en participatie**

De mate en manier waarop in deze fase overleg en / of participatie aan de orde is, is sterk afhankelijk van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die bij aanvang van deze fase ontvangen worden.

### **4.5.3 Timing**

De definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering zal vermoedelijk plaatsvinden rond de zomer van 2024.

### **4.5.4 Documenten**

In deze fase worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- Het GRUP met inbegrip van de milieueffectenbeoordeling;
- Procesnota 5, met de verwerking van de adviezen en bezwaarschriften uitgebracht n.a.v. het openbaar onderzoek.
